

Statinio statybos eigos bei rezultatų skaitmeninis fiksavimas ir dokumentavimas

(faktinių duomenų nustatymas, apdorojimas ir valdymas, elektroninis statybos darbų žurnalas, duomenų apie statinį išsaugojimas ir kt.)

Virginijus Kanaporis

 Cotenders

Statybos etapai ir stadijos pagal BIM

(informacinis statinio modeliavimas)

Projekto etapai	PLANAVIMAS		PROJEKTAVIMAS			STATYBA		NAUDOJIMAS
	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Projekto stadijos	GALIMYBIŲ STUDIJA	PROJEKTO PROGRAMA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	TECHNINIS PROJEKTAS	DARBO PROJEKTAS	STATYBA	STATYBOS UŽBAIGIMAS	NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
Veikla	EKONOMINIS VERTINIMAS	TYRINĖJIMAI	VARIANTŲ ANALIZĖ	PROJEKTAVIMAS	PASIRUOŠIMAS STATYBAI / GAMYBAI	GAMYBA / STATYBOS MONTAVIMO DARBAI	STATINIO PERDAVIMAS NAUDOTI, PALEIDIMAS, DERINIMAS	STATINIO VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Galimi rezultatas	INVESTICINIS PROJEKTAS	TECHNINĖ UŽDUOTIS	ESKIZINIS PROJEKTAS	PROJEKTO DOKUMENTACIJA	DARBO DOKUMENTACIJA	IŠPILDOMOJI DOKUMENTACIJA	STATINYS TINKAMAS PRADĖTI NAUDOTI	STATINYS TINKAMAS NAUDOTI
"Vartai"	SPRENDIMAS VYSTYTI	TECHNINĖS SĄLYGOS	STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS	EKSPERTIZĖS AKTAS	SATYBVIETĖS PERDAVIMO AKTAS	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAI	STATINIO PRIĖMIMO NAUDOTI AKTAS	STATINIO TECHNINĖS APŽIŪROS AKTAI

Pradėti statybos darbus leidžiama

- VTPSI pateikė informaciją apie statybos pradžia;
- perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą;
- perdavė rangovui šiuos dokumentus:
 - parengtą ir patvirtintą statinio projektą ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektą;
 - statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su nustatytaisiais priedais;
 - prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniams statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas;
 - Statybos darbų žurnalą.

Prašymai / pranešimai ▾

- Sukurti naują prašymą / pranešimą
- **Mano prašymai**
- Mano deklaracijos
- Pateiktų prašymų būsenos

Mano statybos >

Veiklos vertinimai >

Profilis >

Neapmokėti dokumentai >

Žinutės >

Vidinių naudotojų sritis >

Naujo pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą įvedimas 🗄

i Duomenys sėkmingai išsaugoti ×

Pagrindinė informacija Papildoma informacija **Projektas** Statiniai Projekto dalyviai Pridedami dokumentai

🔍 Ieškoti 🔍 Ieškoti vidinėje IS

Statinio projekto duomenys

Pavadinimas: * ?

Liko simbolių: 2000

Numeris: *

Parengimo metai: *

2017

Nuoroda į el.
statybos darbų
žurnalą:<http://statyboszurnalas.lt/>Statybos pradžios
data: *

Statytojas: *

+ Pasirinkti

← Atgal → Toliau


6.1. MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR ĮRENGIMŲ PASŲ, KOKYBĖS PAŽYMĖJIMŲ BEI
SERTIFIKATŲ REGISTRAVIMAS

Eilės Nr.	Medžiagų, gaminių, įrengimų		Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data	Dokumentą išdavusios įmonės pavadinimas
	pavadinimai, markė	gavimo data		
1.	Plieminiai vandentiekio vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 3-11 2000.01.13	Tayanropo metalurgijos kombinatas
2.	Plieminiai vandentiekio vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 3-120 1998.05.28	Tayanropo metalurgijos kombinatas
3.	Plieminiai vandentiekio vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 3-134 2000.02.22	Tayanropo metalurgijos kombinatas
4.	Cinkuoti vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 12803 1999.02.27	Lugansko metalurgijos kombinatas
5.	Vandentiekio vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 1423 2000.10.24	Dniepropetrovske metalurgijos kombinatas
6.	Plieminiai vandentiekio vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 469 2000.10.05	Lugansko gamybtos "Santechdetali"
7.	Plieminiai vandentiekio vamzdžiai	2001.01.17	Abitaktinis sertifikatas Nr SPSC-3098 2000.02.17	statybos produkcijos sertifikavimo centras
8.	Polietilenui vamzdžiai	2001.01.17	Kokybiškas sertifikatas Nr 5070 1997.08.21	Pietų Korėja
9.	Naustelės ir fosforiniai dalykai iš polipropileno	2001.01.17	Ne maisto prekių higieninis pažymėjimas Nr 2-2-1-14847/07 1999.09.07	Valstybinis visuminis sveikatos centras
10.	Vandentiekio vamzdžiai PE-AL-PE	2001.01.17	Ne maisto prekių higieninis pažymėjimas Nr 2-2-1-13853/08 1999.08.10	Valstybinis visuminis sveikatos centras

Statybos
leidimas

Statybos
darbų
žurnalas

Statybos
užbaigimo
dokumentas

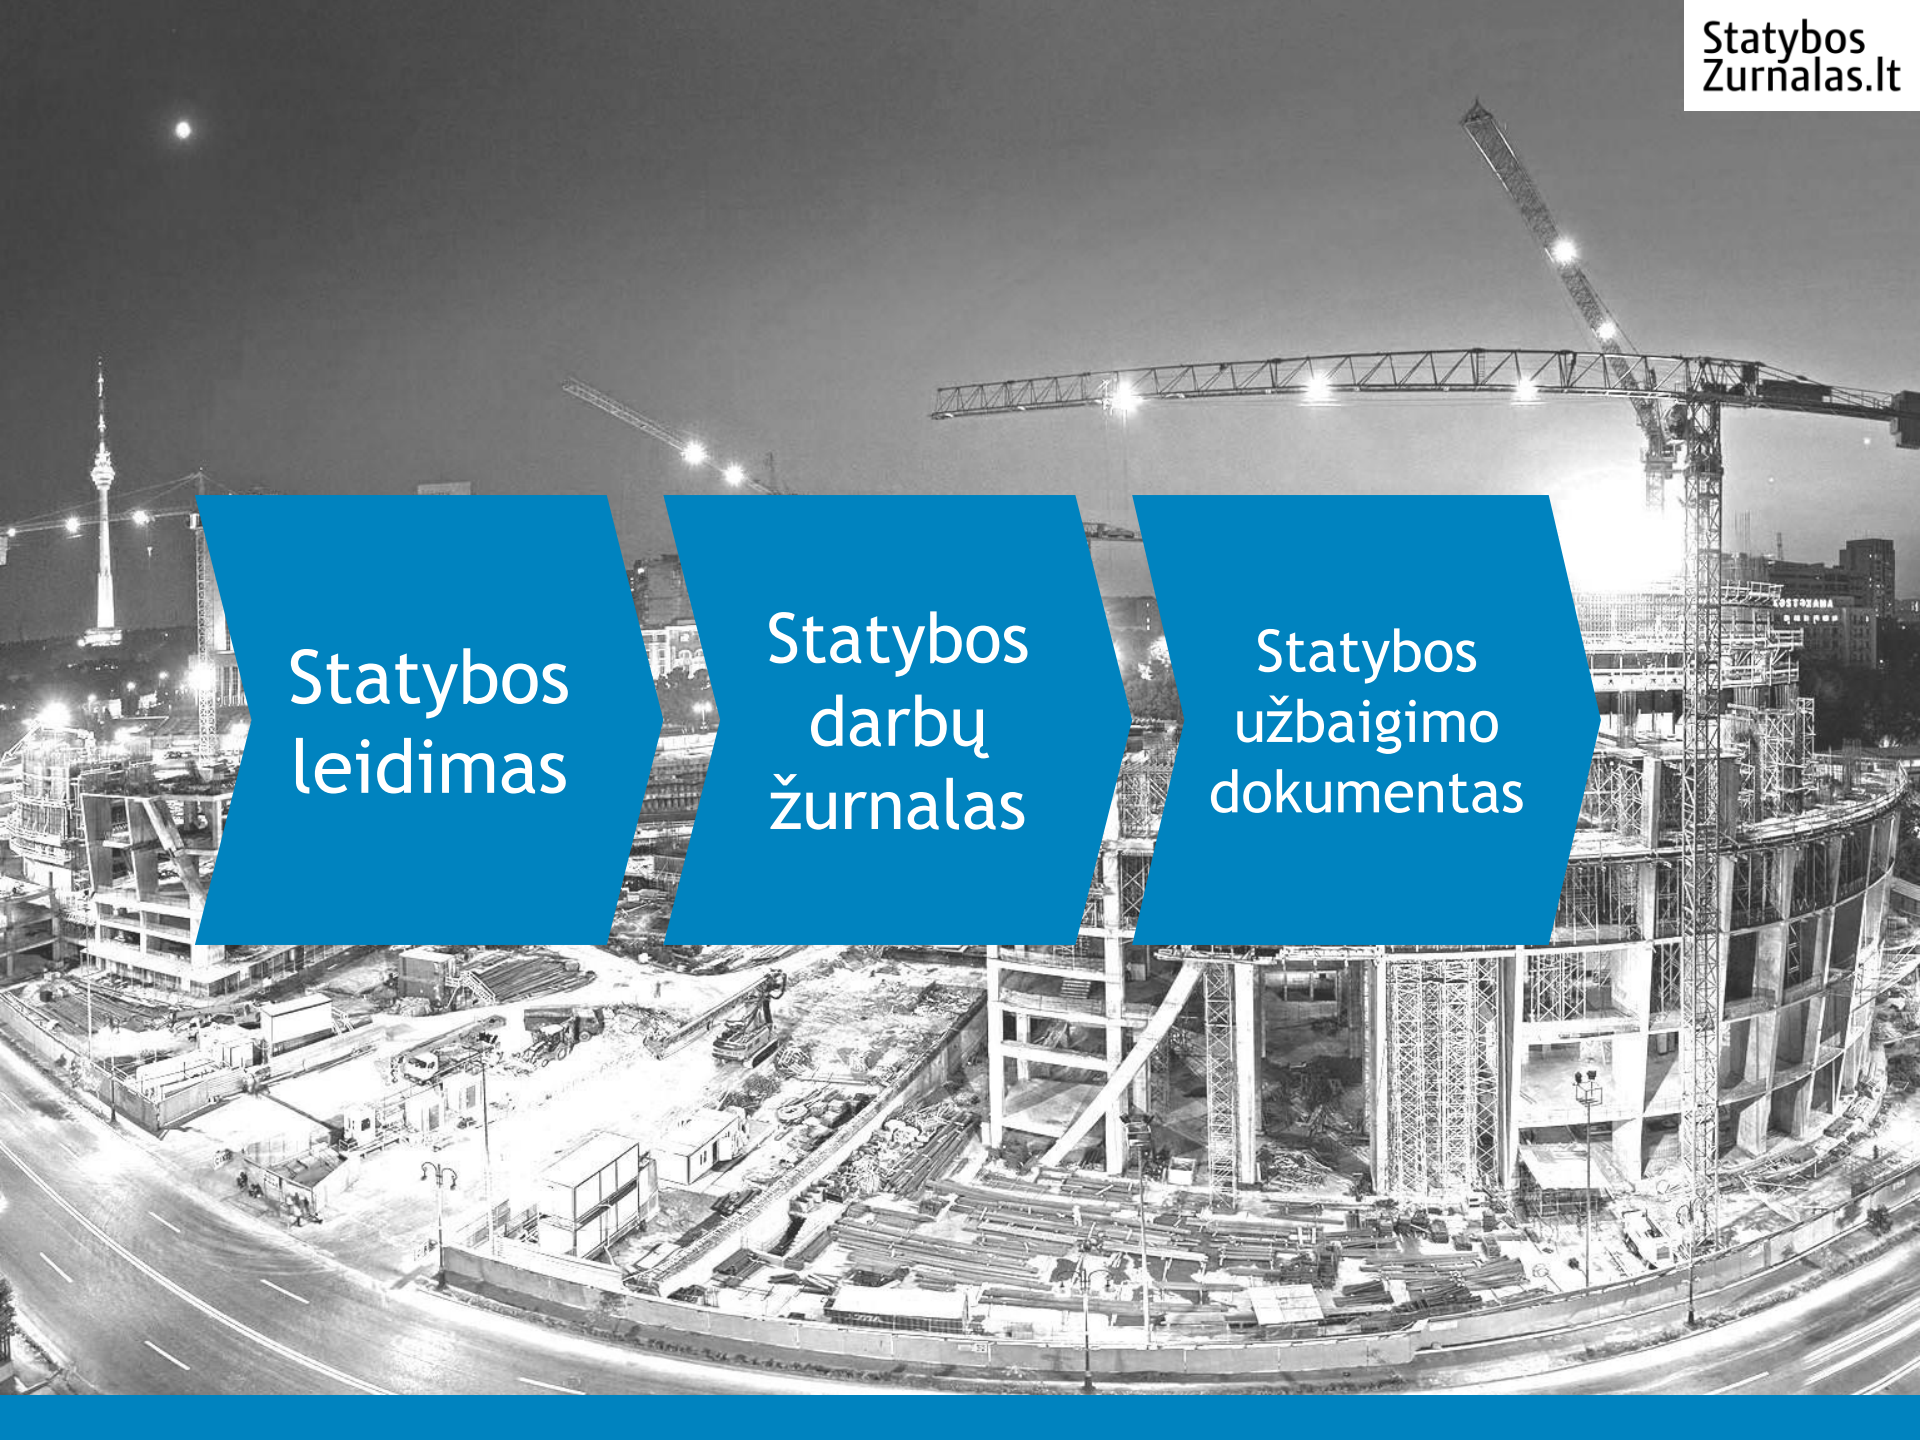

Užsakovas (statytojas)

Projektuotojai

Tech. prižiūrėtojai

Rangovai

Inspektuojančios institucijos

Laiko sąnaudos
Įrašų korekcijos
Savalaikio pildymo kontrolė
Susijusių dokumentų surinkimas
Žurnalų dingimas
Įsipareigojimų nevykdymas
Statyba baigta - kur žurnalas?

Mano projektai

+ Naujas projektas...

„Antakalnio terasos“ daugiabučių restauraciniai darbai

Atnaujinta prieš 47 min.

📄 0



Lietuvos nacionalinio stadiono statybos Ozo g., Vilniuje

Atnaujinta prieš 47 min.

📄 0



Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje

Atnaujinta prieš 39 min.

📄 76



Projektas10

Kauno laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) 2012 metų birželio 15 diena

76
dokum.

■ Pasirašytų: 5
■ Pasirašomų: 6
■ Nepasirašytų: 65

3
vėluojama
pildyti (d.)

1
pasirašymo
trukmė (d.)

Dokumentai mano pasirašymui (7)

📄 F-07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas Nr. 22
prieš 39 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje

📄 F-10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga pasirašoma...
prieš 47 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje

📄 F-10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga pasirašoma...
prieš 47 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje


📄 F-10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga pasirašoma...
prieš 47 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje

📄 F-10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga pasirašoma...
prieš 47 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje


📄 F-10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga pasirašoma...
prieš 47 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje

📄 F-10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga pasirašoma...
prieš 47 min. • Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Ukmergėje

Viskas vienoje vietoje!

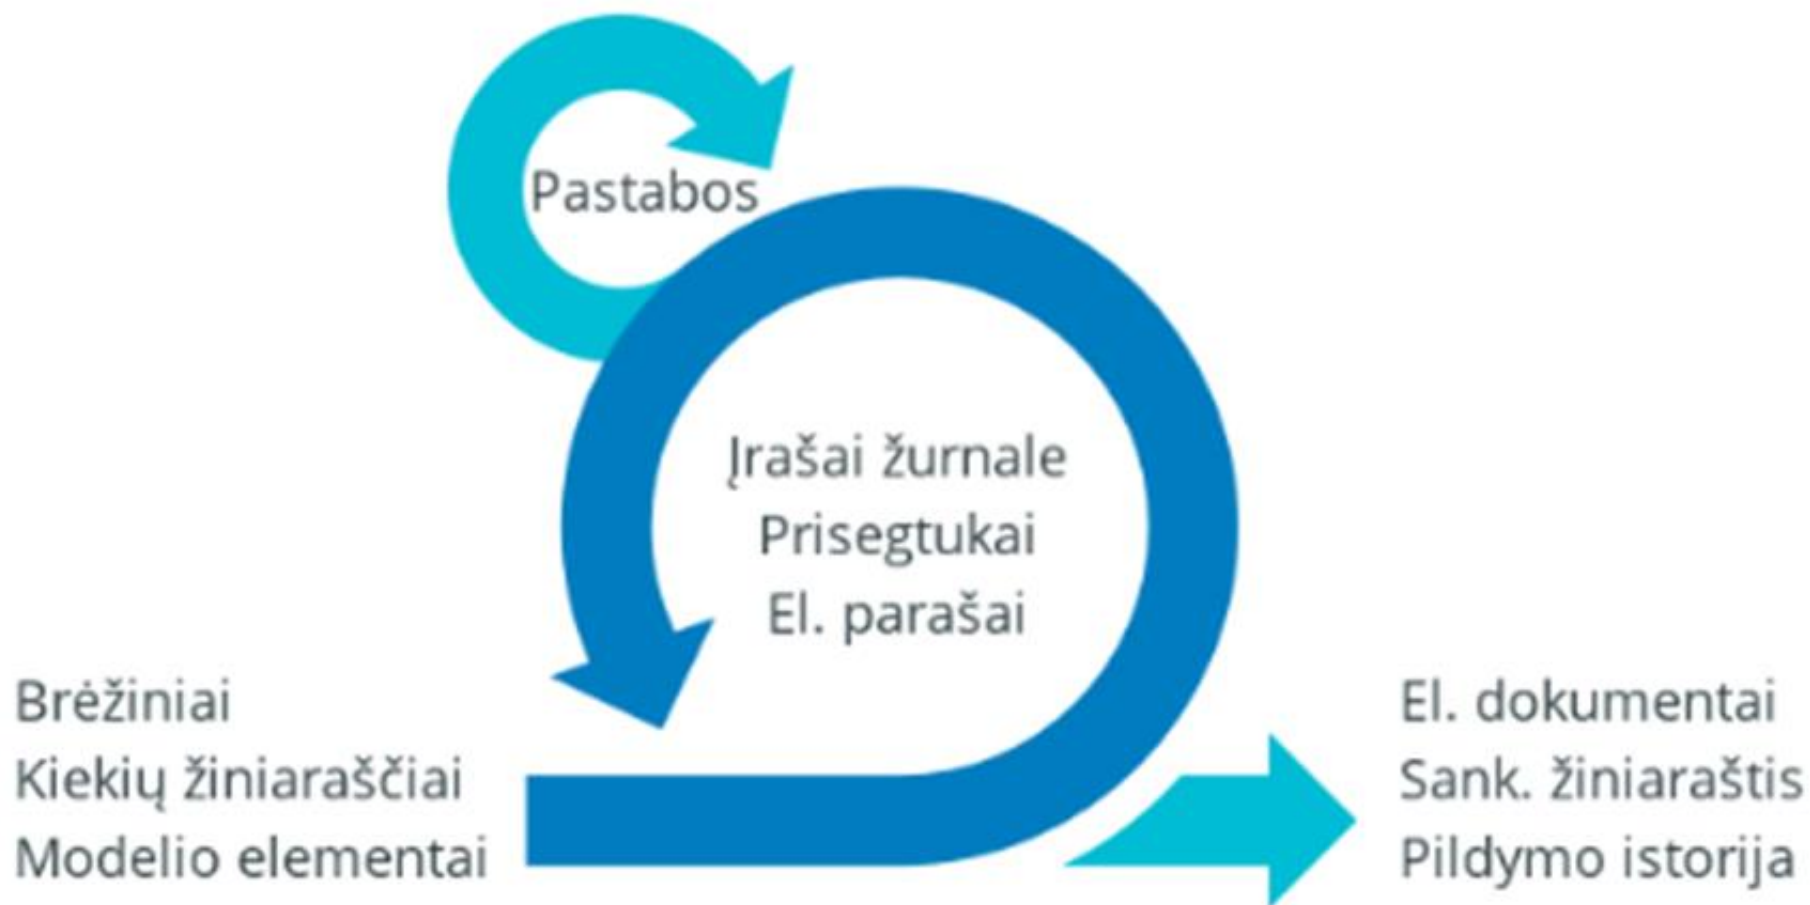

Darbas su sistema StatybosZurnalas.lt

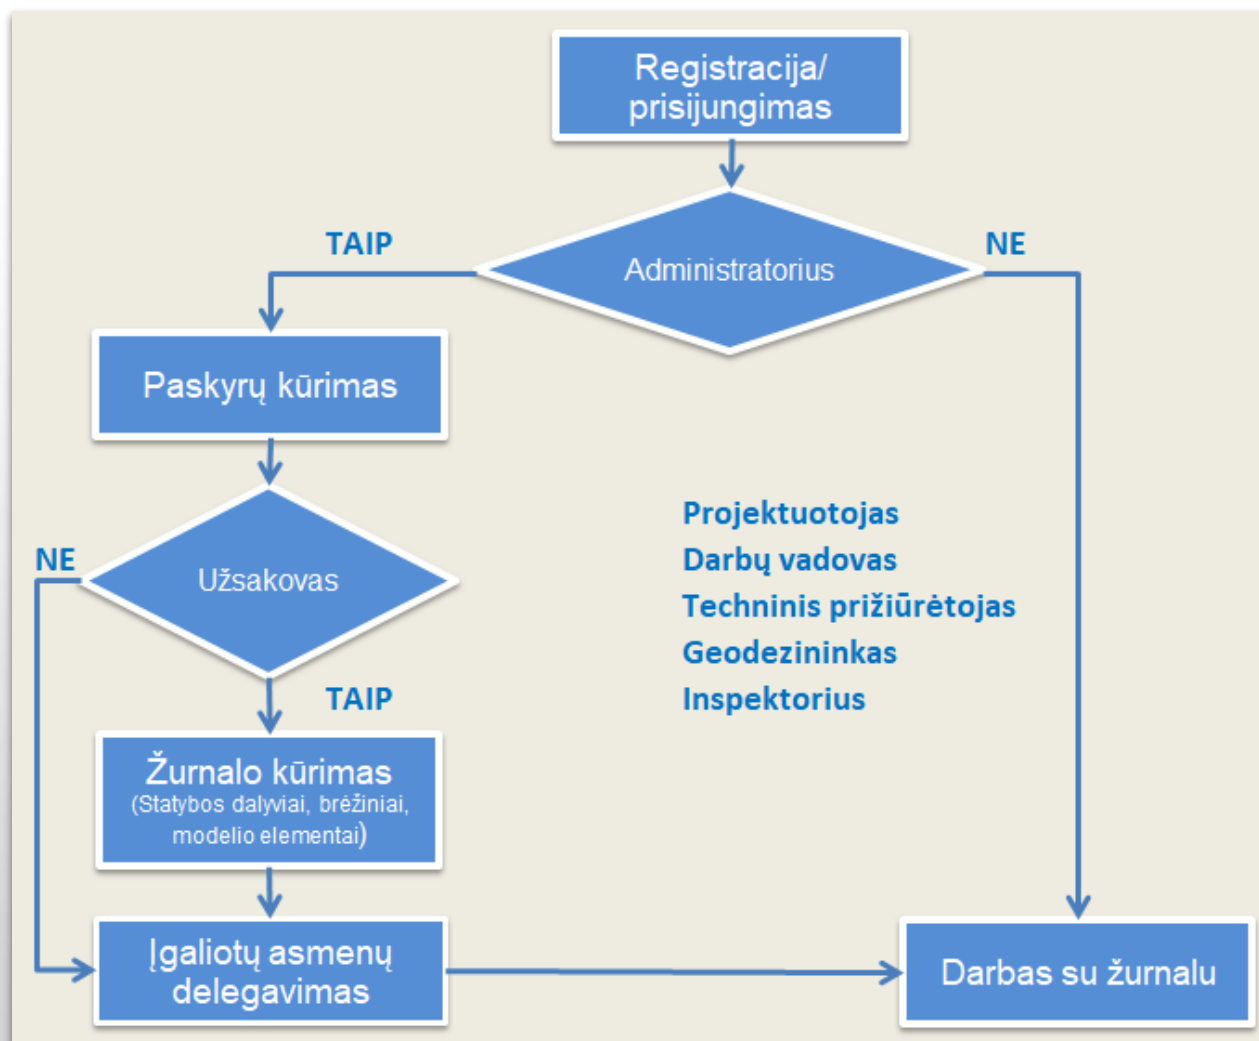

StatybosZurnalas.lt

Statybos
Zurnalas.lt

Funkcijos

Kainos

Apie mus

Kontaktai

RU

PRISIJUNGTI



Elektroninis statybos darbų žurnalas

Statybos dokumentų pildymas ir saugojimas

- + Skaidrumas, atsakomybė, kontrolė
- + Nuotolinis pildymas ir pasirašymas
- + Įgyvendinami STR reikalavimai
- + Dokumentų archyvavimas

StatybosZurnalas.lt — tai dokumentų ir procesų valdymo sistema, skirta el. statybos darbų žurnalo pildymui ir saugojimui pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus¹. Sistema leidžia standartizuotai, operatyviai, skaidriai ir saugiai kaupti įrašus apie vykdomus darbus; įgalina valdomą prieigą prie informacijos, susijusios su statybviete; užtikrina statybos proceso, dalyvių ir įrašų legitimumą.

—
El. statybos darbų žurnalą pildo:

Prisijungimas prie žurnalo

Statybos
Zurnalas.lt

English

Statybos Zurnalas.lt

El. paštas *

Slaptažodis * [Pamiršote slaptažodį?](#)

PRISIJUNGTI

— Nesate užsiregistravęs? —

© Cotenders UAB · Ačiū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt · 2.0.69

Įmonės administratoriai valdo paskyrą

Statybos Zurnalas.lt
+ NAUJAS ŽURNALAS..
?
🔔 117
⚙️
👤 Cotenders UAB

✎️ REDAGUOTI..
+ NAUJAS ASMUO..

🏢 Juridinis asmuo
Cotenders UAB

Įmonės kodas	PVM mokėtojo kodas	Adresas	El. paštas	Telefonas
303488967	LT100010641810	Vytauto g.8 08118 Vilnius Lietuva	info@cotenders.com	+37068722159

ASMENYS SAŠKAITOS PAKEITIMŲ ISTORIJA

ASMUO	LEIDIMAI	ŠALTINIS	AKTYVUS	
VK Virginijus Kanaporis Pareigos: Vadovas Telefonas: +37068722159	• Administratorius	Registų centras Patvirtintas	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
MK Mantas Kanaporis Pareigos: Produkto vadovas Telefonas: +37067285985	• Administratorius	Paskyros administratorius Patvirtintas	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
EV Elžbeta Volk Pareigos: Portalo administratorė Telefonas: +37067497304		Paskyros administratorius Patvirtintas	<input type="checkbox"/>	✕
3 3891223**** NEUŽSIREGISTRAVES Pareigos: Vadovas		Paskyros administratorius Patvirtintas	<input checked="" type="checkbox"/>	✕

Asmens paskyra

Statybos Zurnalas.lt

+ NAUJAS ŽURNALAS..

117

Cotenders UAB

Virginijus Kanaporis

Mano profilis

Keisti slaptažodį..

Paskyros informacija

Keisti paskyrą..

Atsijungti

AKTYVŪS

Statybos darbų žurnalai

Ieškoti tarp statybos darbų žurnalų..

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų stat...

Cotenders UAB

Planas S iki 2020-07-15

Konstrukcijų nulinio ciklo montavimo darbai Sa...

UAB "Baltic Engineers"

Planas S iki 2019-06-15

Daugiabutis gyvenamasis namas (7.3) A. Strazd...

UAB "Timana"

Planas XL iki 2023-01-11

[TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via BA...

AGAIN IT, UAB

Planas M iki 2023-12-31

Prekybos centras Jeruzalės g. 4, Vilnius, Rekons...

Cotenders UAB

Planas L iki 2017-12-31

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų stat...

Cotenders UAB

Planas S iki 2020-07-08

Užsakovas



Registruoja statybos dalyvius

Statybos Zurnalas.lt

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

Apžvalga

Statybos dalyviai

Žurnalo įrašai

Darbų žiniaraštis

Užduotys

Pildymo statistika

Pakeitimų istorija

Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:
– 4 iš 99 vartotojų
– 624 iš 1500 įrašų
– 0 iš 1500 užduočių
– 0.36 iš 15 GB disko vietos

+ NAUJAS..

Statybos dalyviai (4)

Prižiūrėtojas
Mantas Kanaporis

Įmonės kodas
38408290112

VARDAS, PAVARDĖ	TELEFONAS	DIRBA NUO	DIRBA IKI	LEIDIMAI
MK Mantas Kanaporis Vadovas	+37067285985	2018-01-01	2022-12-31	<ul style="list-style-type: none">Galimybė pasirašyti įrašusGalimybė uždaryti knygasGalimybė eksportuoti knygas
ATESTATAS		NUMERIS	IŠDUOTAS	GALIOJA
Java Dev ☞ Dreyfeus model of skill acquis...		abc-123	2019-05-22	2019-05-22 nuo

+ DELEGUOTI ASMENI.. ✎ REDAGUOTI..

Rangovas
Cotenders UAB

Įmonės kodas
303488967

PVM mokėtojo kodas
LT100010641810

Adresas
Vytauto g.8
08118 Vilnius
Lietuva

El. paštas
info@cotenders.com

Telefonas
+37068722159

VARDAS, PAVARDĖ	TELEFONAS	DIRBA NUO	DIRBA IKI	LEIDIMAI
VK Virginijus Kanaporis Vadovas	+37068722159	2019-01-01	2022-06-30	<ul style="list-style-type: none">Galimybė pasirašyti įrašusGalimybė uždaryti knygasGalimybė eksportuoti knygas

Aprašo statybos dalyvį

Statybos Zurnalas.lt

137 Cotenders UAB

Statybos dalyvis

Fizinio ar juridinio asmens kodas *

Rolė *

- Statytojas
- Prižiūrėtojas
- Projektuotojas
- Gen. rangovas
- Rangovas
- Inspektorius

Sutarties data

Sutarties nr.

Leidimai

- Galimybė matyti kitų dalyvių įrašus
- Redaguoti darbų kiekių žiniaraštį
- Aktyvus

Aprašo statinio elementus

Statybos Zurnalas.lt

?
🔔 137
⚙️
👤 Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

- 🏠 Apžvalga
- 👥 Statybos dalyviai
- 📄 Žurnalo įrašai
- Σ Darbų žiniaraštis
- 🗨️ Užduotys
- 📊 Pildymo statistika
- 🕒 Pakeitimų istorija
- ⚙️ Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:

- 4 iš 99 vartotojų
- 624 iš 1500 įrašų
- 0 iš 1500 užduočių
- 0.36 iš 15 GB disko vietos

+ NAUJAS.. 📄 IMPORTUOTI..

Statinio elementai Rodyti viską

Pavadinimas Aktyvus

PAVADINIMAS	AKTYVUS
Daugiabutis korpusas B [ETAPAS:2]	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Šilumos tiekimo tinklai Statinio Nr. 08	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas > Koridorius > Lubos	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Elektrotechnikos dalis 0.4 kW (I Etapas)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas > Koridorius	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Daugiabutis korpusas B > 1 etapas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
101-V10UEA: Atliekų iškrovimo patalpa / Tipping hall > VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis / Water supply and wastewater removal part	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
101-V10UHA: Garo katilo patalpa / Boiler house > SA Architektūros dalis / Architectural part	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Daugiabutis korpusas B > 2 aukštas > Koridorius	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Statinio Nr. 07.2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Stebi darbų eigą objekte

Statybos Zurnalas.lt
+ NAUJAS ŽURNALAS..
?
🔔 117
⚙️
👤 Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

- 🏠 Apžvalga
- 👥 Statybos dalyviai
- 📁 Žurnalo įrašai
- Σ Darbų žiniaraštis
- 🗨️ Užduotys 1
- 📊 Pildymo statistika
- 🕒 Pakeitimų istorija
- ⚙️ Nustatymai


Planas M iki 2023-12-31:
 – 4 iš 99 vartotojų
 – 593 iš 1500 įrašų
 – 2 iš 1500 užduočių
 – 0.33 iš 15 GB disko vietos

Apdaila

Signalizacija

24 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės keitimas	N50-309	vnt	1.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Aliarmo sirenos montavimas/keitimas patalpos viduje	N50-324	vnt	3.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Daugkartinio veikimo automatinės priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas	N50-270	vnt	125.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	N21-190	100m	4.00	64.00	<div style="width: 1600%; height: 10px; background-color: #0070c0;"></div>	1,600% ⋮
Gaisro pavojaus mygtuko keitimas	N50-322	vnt	1.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Laidų stovuose arba nutiestų vamzdžiuose keitimas	R21-2	100m	2.00		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	R23-59	t*	9.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Vėdinimas. Kasetės gatvės pusėje ir visoje mansardoje						
Vėsinimo kasetė 2,5 kW	K2	vnt	8.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Vėsinimo kasetė 3,5 kW	K3	vnt	6.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
Vėsinimo sistemos blokas 2-3 vidinių kasečių, Qš=4-10 kW kompl.	B1	vnt	1.0		<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	⋮
test	21-2	m3*	200.0	2.0	<div style="width: 1%; height: 10px; background-color: #0070c0;"></div>	⋮
BEKANALIO VAMZDYNO SUMONTAVIMO DARBAI						
15 Ø219.1/355 Plieninis izoliuotas atvadas Ø60.3/140 Su gedimų kontrolės laidais (montavimas suvirinant)	BVSD-015	vnt	3.0	1.0	<div style="width: 33%; height: 10px; background-color: #0070c0;"></div>	33% ⋮

Stebi žurnalo pildymą

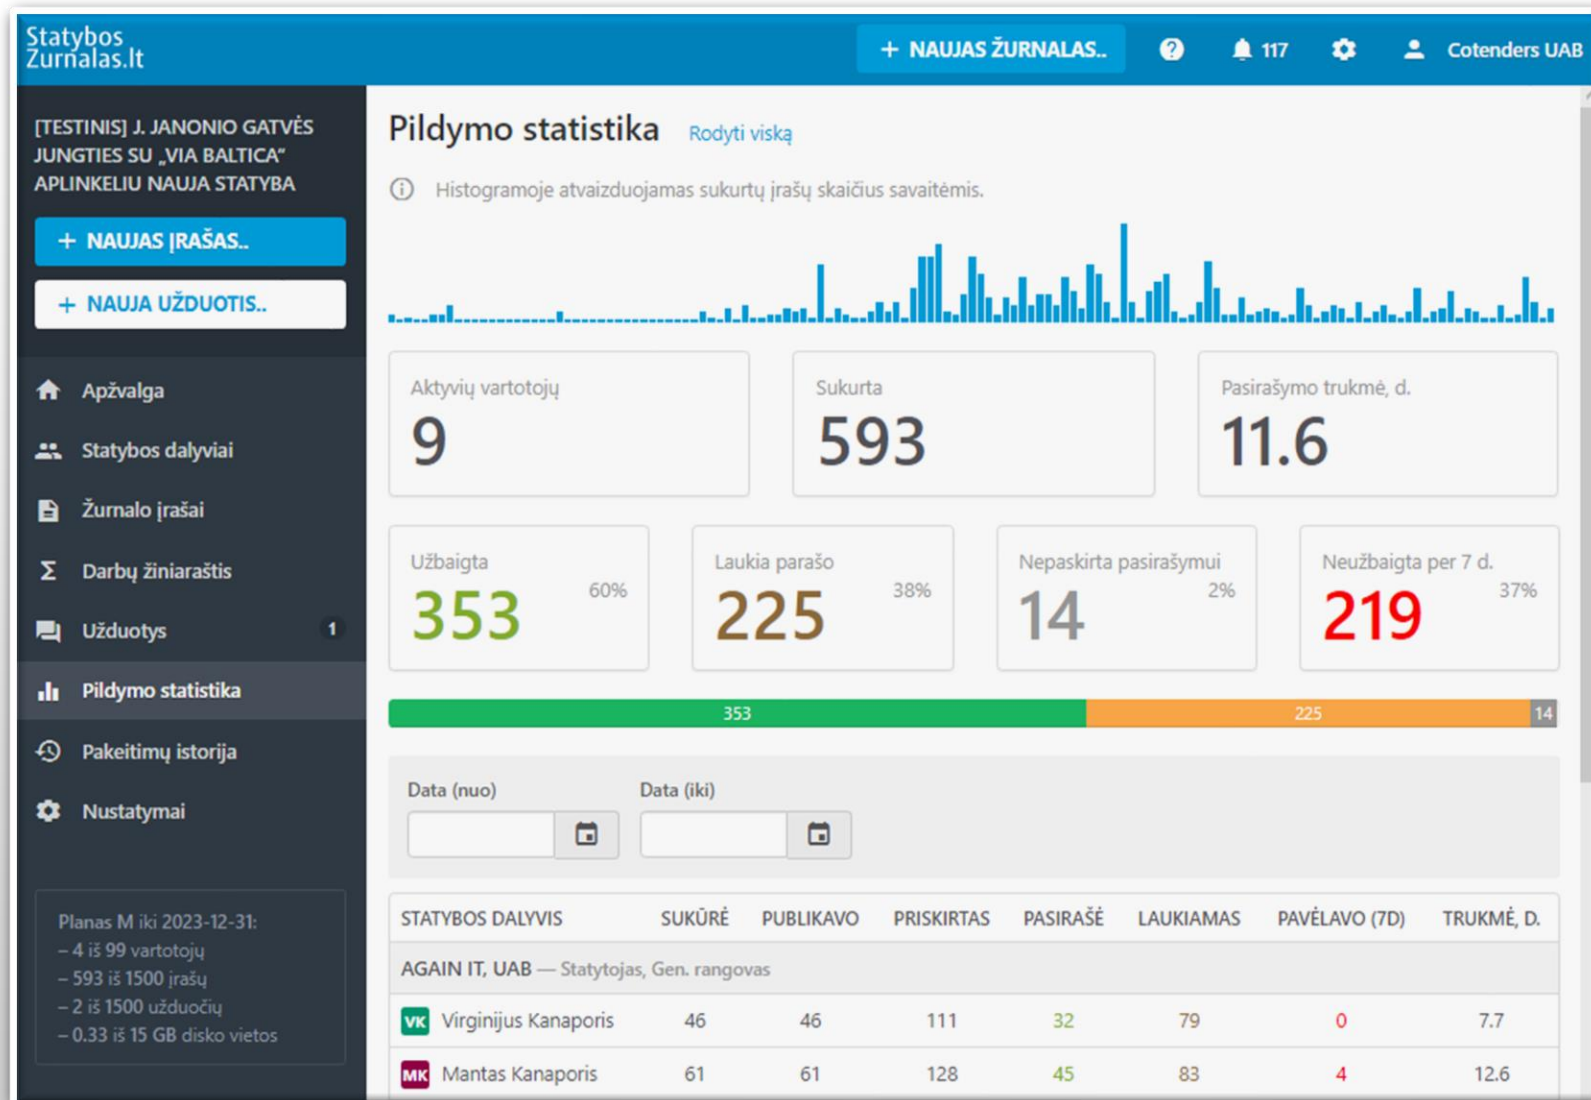



Statinio statybos vadovas

Objekto apžvalgos langas

Statybos Zurnalas.lt
+ NAUJAS ŽURNALAS.. ? 119 Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..


- Apžvalga
- Statybos dalyviai
- Žurnalo įrašai
- Darbų žiniaraštis
- Užduotys 3
- Pildymo statistika
- Pakeitimų istorija
- Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:

- 4 iš 99 vartotojų
- 600 iš 1500 įrašų
- 3 iš 1500 užduočių
- 0.34 iš 15 GB disko vietos

SUARCHYVUOTI
PRATĖŠTI (BE SAŠK)..

🏠 Statybos darbų žurnalas
[TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba



Mano įrašai Rodyti viską

Aš sukūriau

101

Turiu pasirašyti

21

Laukiu kitų

65

Pakeitimų istorija Rodyti viską

2021-02-07, 20:24	Mantas Kanaporis iš "Cotenders UAB" peržiūrėjo pastagą "Laiptai neisdažyti".
2021-02-04, 12:10	Virginijus Kanaporis peržiūrėjo įrašą „F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #818“.
2021-02-04, 12:10	Virginijus Kanaporis priskyrė asmenį „Virginijus Kanaporis“ iš paskyros „Cotenders UAB“ pasirašyti įrašą „F57 Statybos techninio ...
2021-02-04, 12:10	Virginijus Kanaporis sukūrė naują įrašą „F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #818“.
2021-01-27, 00:44	Mantas Kanaporis išjungė skaitymo režimą statybos žurnalui. Prenumerata galioja iki "2024-01-01" (anksčiau: "2056-03-10").
2021-01-26, 09:22	Virginijus Kanaporis įjungė skaitymo režimą statybos žurnalui. Prenumerata galioja iki "2056-03-10" (anksčiau: "2023-12-31").
2021-01-26, 00:04	Mantas Kanaporis peržiūrėjo įrašą „F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #816“.
2021-01-25, 11:46	Virginijus Kanaporis iš "Cotenders UAB" peržiūrėjo pastagą "ESD klaida".

Projekto savininkas
AGAIN IT, UAB

Unikalus nr.
fae71996-5e8b-4d56-9fe4-313fb40b4d6c

Statybos adresas
J. Basanavičiaus g. 29A
03109 Vilnius
Lietuva

Darbų trukmė
2017-03-10 – 2017-12-31

Leidimo Nr.
123456789012345678901234567890

Statybos darbų žurnalo kalba
Lietuviškai

Sukurti darbų kiekių žiniaraštį

Įkeliamo iš Excel

Darbų ir kiekių importas

Statybos dalysis *
- Pasirinkite -

Skyrius
- Pasirinkite -

Nerodote skyriaus? Pridėti naują

Darbai *

Skyrius...
Darbai... Kodas... Mat.vnt... Kiekis...

Pasirinkę įkelti iš Excel išašiuokite paruoštą darbų kiekių žiniaraščių šabloną pagal nurodytą formatą.

Įvedame po vieną darbą

Darbo redagavimas

Statybos dalysis *
- Pasirinkite -

Skyrius *
- Pasirinkite -

Nerodote skyriaus? Pridėti naują

Darbai *

Kodas *

Planuota * Mat.vnt. *
- Pasirinkite -

Aktyvus

ĮSAUGOTI **ATŠAUKTI**

© Cotenders UAB - AŠD, kad naudojate StatybosZurnalas.lt - 2021.0.3

Importas darbų kiekių žiniaraštis

Darbu kiekių žiniaraštis ir konstrukciniai elementai

Failas Redaguoti Peržiūra Įterpti Formatas Duomenys Įrankiai Priedai Pagalba Paskutinį kartą redaguota sausio 23 d.

100% Lt % .0 .00 123 - Arial 10 B I A

Stogas

	A	B	C	D
39	Kiemo fasadas			
40	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis daugiau 15 m (100m2 vertikalios projekcijos)	N15P-1501	100m2	7.2
41	Kopėčių konstrukcijų išmontavimas	N39-16	t	0.5
42	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2	R11-1	m2	120
43	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	N15P-1001	100m2	5.4
44	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m	N60-14	m	48
45	Sienu šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniška, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	N26P-1206	100m2	6.2
46	Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkeliu, kai viršutinis tinko sl. Dekoratyvinis	N15-104-3	100m2	6.2
47	Pastatų išorinių tinkuojamų pav. angokraščių kampų papild. sutvirtinimas armuojančiu tinkeliu. juostomis (100m2 tinkeliu)	N15P-1314	100m2	1.1
48	Fasadų dažymas fasadiniais dažais nuo pastolių	N15-237	100m2	6.2
49	Fasadų sienų rustuotų paviršių tinko pertrynimai	A8-68	m2	96
50	Išorinių tiesių traukų paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių	R11-61	m2	18
51	Fasadų rustuotų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dirbant ant pastolių	R14-183-10	100m2	0.96
52	Karnizo apskardinimas	N60-10	100m2	0.37
53	Sienu mansardoje apšiltinimas 5 cm storio mineralinės vatos plokštėmis vienu sluoksniu iš vidaus	N26-200	m3	3
54	Kopėčių konstrukcijų montavimas	N39-16	t	0.2
55	Fasadų konstrukcijų (išorės palangių) apskardinimas	N12-138	100m2	5.4
56	Aluminiuo-stiklo stogelio rėmin. konstr. stiklinimas, tvirtinant profiliais, kai stiklo paketo plotas daugiau 2 m2	N2P-0503	m2	8
57	Grotelės iš juostinio plonalakščio nerūdijančio plieno stogelių apsaugai	N9-129	t	0.05
58				
59	Pamėnkalnio/V. Kudirkos g. fasado remontas			
60	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100m2 vertikalios projekcijos)	N15P-1501	100m2	10.5
61	Pastolių uždengimas apsaugine danga	N15P-1503	100m2	7.2
62	Betono konstrukcijų (lauko laiptų) ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai	F46-1-7	m3	3
63	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	R16-36	100m2	0.18
64	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio-cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x70mm	R27P-20-2	100m2	0.18
65	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas (laiptai)	N6P-0801	m3	3.2
66	Teraco plytelių danga laiptų aikštelei	N11-84	100m2	0.06
67	Laiptų pakopų ir papakopių aptaisymas, klijuojant teraco plokštes	N15-10-7	m2	9
68	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu	N23P-0708	vnt	1
69	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)	R11-76-21	100m2	4.2
70	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1/2 plytos	R3-28	m2	823.3
71	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai remontuojamas plotas 1m2 ir užtaisomos vietos storis 1/2 plytos	R3-29	m2	631.19
72	Fasadų lygaus dekoratyv. (marmuro trupinių) tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas iki 1 m2	R11-7	m2	8
73	Fasadų dekorat. (marmuro trup.) tinko su įrėž. Rustais remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas iki 1 m2	R11-16	m2	47
74	Fasadų dekorat. (marmuro trup.) tinko su įrėž. Rustais remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas iki 5 m2	R11-17	m2	8
75	Tiesinių išorinių angokraščių dekoratyvinio (skied. su marmuro trupiniais) tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės)	R11-44	m2	8
76

Kaupiamas darbų kiekių žiniaraštis

Statybos Zurnalas.lt

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIŲ SU „VIA BALTICA“ APLINKELIŲ NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

- Apžvalga
- Statybos dalyviai
- Žurnalo įrašai
- Darbų žiniaraštis**
- Užduotys 2
- Pildymo statistika
- Pakeitimų istorija
- Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:
 - 4 iš 99 vartotojų
 - 669 iš 1500 įrašų
 - 3 iš 1500 užduočių
 - 0.38 iš 15 GB disko vietos

ATSISIŪSTI (CSV) + NAUJAS.. IMPORTUOTI..

Darbų kiekių žiniaraštis Rodyti viską

DARBAI SKYRIAI

Dalyvis (paskirtas) AGAIN IT, UAB

Dalyvis (dirbo) Cotenders UAB

Darbų skyrius - Visi -

Būsena

Dirbta (nuo)

Dirbta (iki)

DARBAI	KODAS	MAT.VNT.	PLANUOTA	ATLIKTA
BEKANALIO VAMZDYNO SUMONTAVIMO DARBAI				
15 Ø219,1/355 Plieninis izoliuotas atvadas Ø60.3/140 Su gedimų kontrolės laidais (montavimas suvirinant) AGAIN IT, UAB	BVSD-015	vnt	3.0	1.0 33%
DT3				
Grindų armavimas tinklais AGAIN IT, UAB	DT3-01	m2*	2,931.2	988.0 34%
Gaisro technika				
Testinis Merko AGAIN IT, UAB	96	100m	12.00	13.00 108%
Gelžbetoninės kolonos				
Gelžbetoninės kolonos betonavimas AGAIN IT, UAB	0001	m3	4.307	4.307 100%
Gelžbetoninės kolonos klojinių montavimas AGAIN IT, UAB	0002	kompl	640.0	63.0 10%

Pasirenka įrašo formą

Statybos Zurnalas.lt + NAUJAS ŽURNALAS... 117 Colenders UAB

1. FORMA / 2. TURINYS / 3. PASIRAŠANTIEI

Naujas įrašas NAUJI DARBAI

I skyrius: Pagrindiniai duomenys apie statinį, statinio projektą ir kitą statybos dokumentaciją

II skyrius: Statybos darbų eiga

- F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas
- F08 Metalinių dalių suvirinimo eiga
- F09 Suvirintų sujungimų antikorozinė apsauga
- F10 Sandorių ir mazgų užbetonavimo eiga
- F11 Siūlių sandarinimas
- F12 Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga
- F13 Metalinių konstrukcijų suvirinimo eiga
- F14 Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga

III skyrius: Geodezinė kontrolinė dokumentacija

IV skyrius: Paslėptų darbų ir laikinųjų konstrukcijų patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktai

V skyrius: Statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktai

VI skyrius: Statinio statyboje panaudotų statybos produktų dokumentų ir įrenginių kokybę įrodančių dokumentų registravimas

VII skyrius: Kontroluojančiųjų asmenų pastabos

Priedas B: Kelių (gatvių) techninė priežiūra

Priedas C: Kitų transporto statinių techninė priežiūra

Statybos Zurnalas.lt + NAUJAS ŽURNALAS... 117 Colenders UAB

1. FORMA / 2. TURINYS / 3. PASIRAŠANTIEI

Naujas įrašas NAUJI DARBAI

I skyrius: Pagrindiniai duomenys apie statinį, statinio projektą ir kitą statybos dokumentaciją

II skyrius: Statybos darbų eiga

III skyrius: Geodezinė kontrolinė dokumentacija

IV skyrius: Paslėptų darbų ir laikinųjų konstrukcijų patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktai

V skyrius: Statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktai

VI skyrius: Statinio statyboje panaudotų statybos produktų dokumentų ir įrenginių kokybę įrodančių dokumentų registravimas

VII skyrius: Kontroluojančiųjų asmenų pastabos

Priedas B: Kelių (gatvių) techninė priežiūra

Priedas C: Kitų transporto statinių techninė priežiūra

- C1 Darbu priėmimo aktas
- C1.1 Kelių transporto statinių geodezinio pagrindo priėmimo aktas
- C1.2 Atarimų nuolyginimo priėmimo aktas
- C1.3 Atarimų pamatų duobės priėmimo aktas
- C1.3.1 Pelių priėmimo aktas
- C1.4 Atarimų priėmimo aktas
- C1.5 Pėsčiųjų priėmimo aktas
- C1.6 Vykdomosios akustikos priėmimo aktas
- C1.7 Hidroizoliacijos su vandens nuvedimu įrenginių priėmimo aktas
- C2 Pagalbinių statinių ir įrenginių priėmimo aktas
- C2.1 Betoniniai: Kėlinių priėmimo aktas
- C2.2 Betoniniai: Sušilimo armatūros priėmimo aktas
- C2.3 Betoniniai: Monolitinių betono priėmimo aktas
- C4 Samaniniai suvėrimo konstrukcijų priėmimo aktas
- C5.1 Metalinių konstrukcijų dužimas: Metalinių konstrukcijų naudojimo prieš grūdinimą priėmimo aktas
- C5.2 Metalinių konstrukcijų dužimas: Dažymo darbų priėmimo aktas

© Colenders UAB | APL kodas: StatybosZurnalas.lt | 2025.02.4

Aprašo atliktus darbus

Statybos Zurnalas.lt

+ NAUJAS ŽURNALAS...

117

Cotenders UAB

1. FORMA / 2. TURINYS / 3. PASIRAŠANTIEJI

F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #813

Statybos dalyvis * Cotenders UAB

Data * 2020-12-14

Statinio elementas * Dauglūbutis

Redaguoti statinio elementus

Darbai *

N50-270: Daugkartinio veikimo automatinės priėgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas

Atlikta * 15 vnt

Il viso 44 iš 125 vnt (35%)

Nerandate darbo? Papildyti darbų žiniaratę

Statybos darbų vieta ir eiga *

Koidorius

Aukštas, žiūrėti atitūdes

Atsakingas vykdytojas

Vardenis Pavardenis

Oro sąlygos

Debesuota. Temperatūra: -2/0°C. Vėjas: 2m/s. Drėgmė: 92%

UŽKELTI

Papildomos pastabos

Susieti įrašai

F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas

+ PRIDĖTI

IŠSAUGOTI ATŠAUKTI

© Cotenders UAB · Ažiū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt · 2020.12.4

Pasirenka susietus įrašus

Statybos Zurnalas.lt

NAUJAS ŽURNALAS 117 Cotenders UA

Įrašų pasirinkimas [Rodyti viską](#) **ATŠAUKTI PASIRINKTI**

Paieška

Nr.

Mano įrašai

Būsena

Anuliavimas

Statybos dalyvis

Statinys

Knyga

Forma

Darbai

Skynius

Data (nuo)

Data (iki)

<input type="checkbox"/>	PAVADINIMAS	ĮMONĖ	PRŠ	DATA ↑	B
<input type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #805 Betonas c25/30 / esd Nr xxx,2020-(.) Dauglabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK	2020-12-06	⊙
<input type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #749 Betonas C 25/30 / ESD, Nr. xxxx, 2(.) Dauglabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK	2020-08-04	⊙
<input checked="" type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #741 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(.) Dauglabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK MKB MK VK	2020-07-17	⊙
<input type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #739 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(.) Dauglabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	MK VK	2020-07-17	⊙
<input checked="" type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #738 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(.) Dauglabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK VK MK	2020-07-15	⊙
<input type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #725 betonas C25/30 / ESD, Nr.bbbnbbmnb(.) Dauglabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK VK MK	2020-07-14	⊙
<input checked="" type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #719 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(.) Dauglabutis korpusas A [ETAPAS:1]	Cotenders UAB Knyga Nr. 68	VK MK VK	2020-07-09	⊙
<input type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #711 betonas C25/30 / ESD, bbbnbbmnb(.) Dauglabutis korpusas A [ETAPAS:1]	Cotenders UAB Knyga Nr. 68	VK VK	2020-06-17	⊙
<input type="checkbox"/>	F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas	Cotenders UAB Knyga Nr. 68	VK	2020-05-26	⊙

Priskiria pasirašančiuosius

1. FORMA / 2. TURINYS / 3. PASIRAŠANTIEJI

F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #813



Greituju būdu nurodykite, kas pasirašys įrašą:



PASIRAŠYSIU AŠ



PASIRAŠYSIU AŠ IR
TECH. PRIŽIŪRĖTOJAS



PASIRAŠYSIU AŠ,
TECH. PRIŽIŪRĖTOJAS
IR UŽSAKOVAS

... arba parinkite pasirašančius atsakingus asmenis individualiai:

PRIDĖTI

~ Įrašų nėra ~

Suformuotas dokumentas

Statybos Zurnalas.lt
+ NAUJAS ŽURNALAS..
118
Cotenders UAB

[[TESTINIS]] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

- Apžvalga
- Statybos dalyviai
- Žurnalų įrašai
- Darbų žiniaraštis
- Užduotys 1
- Pildymo statistika
- Pakeitimų istorija
- Nustatymai

Planas M iki 2023-12-31:
 - 4 iš 99 vartotojų
 - 594 iš 1500 įrašų
 - 2 iš 1500 užduočių
 - 0.33 iš 15 GB disko vietos

➔ PASIRAŠYTI..
✎ REDAGUOTI..
🗑️ IŠTRINTI
📄 KOPIJUOTI
➡ PERKELTI..
⬇️ ATSIŠIŪSTI
🔗 SUSIETI..
📄 UŽDUOTIS..

II skyrius: Statybos darbų eiga / F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas

[IRAŠAI]
[SKYRIAI]
[KNYGOS]
[ARCHYVAS]

Būseną ○ Juodraščiš

Statybos dalyvis 👤 Cotenders UAB

Data 📅 2020-12-14

Statinio elementas 🏠 Daugiabutis

Krygia 📄 Krygia Nr. 85 (Juodraščiš)

TURINYS PERŽIŪRA SUSIETI ĮRAŠAI ISTORIJA

Darbai	N50-270: Daugkartinio veikimo automatinės priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas
Atlikta	15.0 vnt iš viso 59 iš 125 vnt (47%)
Statybos darbų vieta ir eiga	Koridorius
Atsakingas vykdytojas	Vardenis Pavardenis
Oro sąlygos	Debesuota. Temperatūra: -2/0°C. Vėjas: 2m/s. Drėgmė: 92%.

📄 F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #741 🗨️ 🔄
 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(,) Daugiabutis

📄 F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #719 🗨️ 🔄
 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(,) Daugiabutis korpusas A [ETAPAS:1]

📄 F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #738 🗨️
 prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(,) Daugiabutis

📄 PRISEGTL.

Parašai

VK Virginijus Kanaporis
 Cotenders UAB
 Rangovas Laukiama..

MK Mantas Kanaporis
 Mantas Kanaporis
 Prižiūrėtojas Laukiama..

📄 PAKVIESTI..

Unikalus nr.

4d487204-a70d-4f06-bd1c-a1bc4f65eae8

Sukurta: prieš 1 min.
Redaguota: dabar

© Cotenders UAB - Aiū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt - 2020.12.4

Paslėptų darbų priėmimo aktų pildymas

Statybos Zurnalas.lt
161
Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

- Apžvalga
- Statybos dalyviai
- Žurnalo įrašai
- Darbų žiniaraštis
- Užduotys 2
- Pildymo statistika
- Pakeitimų istorija
- Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:

- 4 iš 99 vartotojų
- 669 iš 1500 įrašų
- 3 iš 1500 užduočių
- 0.38 iš 15 GB disko vietos

NAUJA REDAKCIJA..
ANULIUOTI..
KOPIJUOTI
PERKELTI..
ATSISIŪSTI

📄

II skyrius: Statybos darbų eiga / F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas

F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #883

Būsena

🕒 Pasirašomas

Statybos dalyvis

🏢 Cotenders UAB

Data

📅 2021-09-12

Statinio elementas

🏠 Administracinis pastat

Knyga

📖 Knyga Nr. 88 (Juodraštis)

TURINYS
PERŽIŪRA
SUSIETI ĮRAŠAI
ISTORIJA

Darbai	N11-171 (S9=1,153): 19. Grindų armavimas, nišant atskirus armatūros strypus į tinklus
Atlikta	0.480 t iš viso 0.48 iš 1.233 t (39%)
Statybos darbų vieta ir eiga	Rrūsyje
Atsakingas vykdytojas	Vardenis Pavardenis
Oro sąlygos	Lietus. Temperatūra: 12/23°C. Vėjas: 3m/s (gūšiai iki 7m/s). Drėgmė: 78%.

📄 F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #111

Armatūra Ø10 / NR. 103/13, 2017(..)

Daugiabutis korpusas A [ETAPAS:1]

II skyrius: Statybos darbų eiga

- F08 Metalinių dalių suvirinimo eiga
- F09 Suvirintų sujungimų antikorozinė apsauga
- F10 Sandūrų ir mazgų užbetonavimo eiga
- F11 Siūlių sandarinimas
- F12 Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga
- F13 Metalinių konstrukcijų suvirinimo eiga
- F14 Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga

F25 įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą

F27 įrašas apie dalinį laikinųjų konstrukcijų priėmimą

VII skyrius: Kontroluojančiųjų asmenų pastabos

- F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba
- F58 Statybos projekto vykdymo prižiūrėtojo pastaba
- F59 Valstybinės priežiūros institucijos pastaba

👉 PAKVIESTI..

Unikalus nr.

01f8e419-17db-40c5-938d-04070bb6e744

Sukurta: prieš 17 d.

Redaguota: prieš 7 d.


Dalinio paslėptų darbų priėmimo forma


Statybos
Zurnalas.lt

161 Cotenders UAB

F25 [rašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą #888


Statybos dalyvis * Cotenders UAB

Data * 2021-09-12 

Statinio elementas * Administracinis pastatas Statinio Nr. 01 

[Redaguoti statinio elementus](#)

Priimti darbai *

F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #883 

+ PRIDĖTI

Darbai atlikti pagal projektą


+ PRIDĖTI

Kontrolinė nuotrauka

+ PRIDĖTI

Kontrolinės nuotraukos atlikimo data ir Nr.

Patikrinimo išvados



Atitinka brėžinius Nr. ar yra nukrypimų. Geodezinių nuotraukų atlikimo data, Nr.

Susieti įrašai

+ PRIDĖTI

Sistema užpildė Dalinio paslėptų darbų priėmimo formą F25

The screenshot displays the 'Statybos Zurnalas.lt' web interface. The main content area shows the 'F25 [rašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą #886]' form. The form is divided into several sections:

- Prilinti darbai:** F07 Bendųjų statybos darbų vykdymas #883. Darbas: N11-171 (S9+1,153); 19. Grindų armavimas, esant atskirus armatūros strypus į tinklus. Artilika: 0.480 t. Statybos darbu vieta ir eiga: Rūdyje.
- Darbai atlikti pagal projektą:** F04 05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #850. Pavadinimas: Grindys. Numeris: PRC17_551_DP_SA_05.
- Kontrolinė nuotrauka:** F15 Geodezinė kontrolinė nuotrauka #803. Schemų, nuotraukų pavadinimai: Išpildomoji nuotrauka. Patikrinimo išvados: Test.
- Statybos produktai:** F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasiūlymų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #111. Statybos produktai ir įrenginiai: Armatūra Ø10. Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data: NR_108/13, 2017-12-18. Dokumentą išdavusi įmonė: įmonės pavadinimas, UAB.
- Patikrinimo išvados:** Atitinka projektą PRC17_551_DP_SA_05.

On the right side, there is a 'Parašai' section with two entries:

- Virginijus Kanaporis, Cotenders UAB, Rangovas, 2021-09-27 11:44.
- Mantas Kanaporis, Mantas Kanaporis, Priežirotas, Laukama.

Below the signatures is a 'Unikalus nr.' field containing the value: 3785d19e-6e5a-4ac6-a604-c7c97b9fae9. It also shows 'Sukurta: prieš 7 d.' and 'Redaguota: prieš 3 d.'

The bottom of the page features a footer: © Cotenders UAB · AGU, kad naudotųte StatybosZurnalas.lt · 2021.9.3

Paslėptų darbų akto pasirinkimas

The screenshot displays the web application interface for Statybos Zurnalas.lt. The browser address bar shows the URL: `app.statyboszurnalas.lt/projects/faq71996-5e8b-4d56-9fe4-313fb40b4d6c/documents/...`. The page title is "F25 Įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą #886".

The main content area shows the document details for "F25 Įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą #886". The document is categorized as "Pasirašomas" (Signed) and is associated with "Statybos dalyvis" (Participant) "Cotenders UAB" and "Administracinis pastabas" (Administrative notes). The date is "2021-09-12".

A red arrow points to the "SUSIETI..." (Related) dropdown menu, which is open and shows a list of related documents:

- IV skyrius: Paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų patikrinimas
 - F24 Paslėptų darbų patikrinimo aktas
- VII skyrius: Kontroluojančiųjų asmenų pastabos
 - F57 Statybos techninio priežiūrėjo pastaba
 - F58 Statybos projekto vykdymo priežiūrėjo pastaba
 - F59 Valstybinės priežiūros institucijos pastaba

The left sidebar contains navigation options: "NAUJAS ĮRAŠAS...", "NAUJA UŽDUOTIS...", "Apžvalga", "Statybos dalyviai", "Žurnalo įrašai", "Darbų žiniaraštis", "Užduotys" (2), "Pildymo statistika", "Pakeitimų istorija", and "Nustatymai".

The right sidebar shows "Parašai" (Signatures) with two entries:

- Virginijus Kanaporis (Cotenders UAB, Rangovas) - 2021-09-27 11:44
- Mantas Kanaporis (Mantas Kanaporis, Priežiūrėtojas) - Laukiama...

Below the signatures is a "PAKVIESTI..." button. The "Unikalus nr." (Unique ID) is "3785d19e-6e5a-4ac6-a604-c7c97b9fae9". The document was created 7 days ago and last edited 3 days ago.

The main content area also includes a "TURINYS" (Table of Contents) section with tabs for "PERŽIŪRA" (Review), "SUSIETI ĮRAŠAI" (Related Documents), and "ISTORIJA" (History). The "Priimti darbai" (Accepted Works) section lists:

- F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #883: Darbai: N11-171 (S9=1,153): 19. Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus. Atlikta: 0.480 t. Statybos darbų vieta ir eiga: Rrūsyje.
- F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #850: Pavadinimas: Grindys. Numeris: PRC17-551-DP-SA-05.
- F15 Geodezinė kontrolinė nuotrauka #803: Schemų, nuotraukų pavadinimai: Išpildomoji nuotrauka. Patikrinimo išvados: Test.
- F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #111: Statybos produktai ir įrenginiai: Armatūra Ø10.

Paslėptų darbų akto pildymas

Statybos Zurnalas.lt ? 161 ⚙️ 👤 Cotenders UAB

F24 Paslėptų darbų patikrinimo aktas #888

Statybos dalyvis * Data * Statinio elementas * Redaguoti statinio elementus

Jrašai apie dalinį darbų priėmimą *

Nukrypimai nuo projekto

Nurodyti ar yra nukrypimų, jei yra nukrypimų, juos išvardyti ir nurodyti registravimo Nr. F-5 formoje

Leidžiami vykdyti tolesni darbai *

Susieti įrašai

Užpildytos formos F24 - įrašas

Statybos
Zurnalas.lt

(TESTING) Į JŪSŲ KONTAS
GATVĖS ŽUNGITIS SU „VIA
BALTICA“ APLINKELIŲ
NAUJA STATYBA

[+ NAUJAS ĮRAŠAS...](#)

[+ NAUJA UŽDUOTIS...](#)

Apšvietas

Statybos dalys

Žurnalo įrašai

Darbo šrienerklis

Uždavys 2

Pildymo statistika

Pakeitimų istorija

Nustatymai

Pilnas M. iki 2024-01-01
- 4 ir 99 vertimų
- 602 ir 1550 įrašų
- 3 ir 1800 užduočių
- 0,38 ir 15 GB vieno
vieno

Ne visi sušieti įrašai yra pakeičyti! Norėdami pakeičyti įrašą, pirmiausia privatote pakeičyti sušietus. (Tep pat atidžiai, kad turinys nėra nurodų, į neapibrėžtų sušietus įrašus.)

REDAGUOTI...
ISTINTI
KOPUOTI
PERKELTI
ATSISIUSTI
SUSIETI...
UŽDUOTIS...

Įv skyrius: Pasleptų darbų ir lėkiančių konstrukci... / F24 Pasleptų darbų patikrinimo aktais

F24 Pasleptų darbų patikrinimo aktais #679

Įrašas: Statybos dalys / Cotenders UAB
Data: 2021-07-09
Statinio elementas: Daugiabutis
Knogė: Knogė Nr. 05 (Juodaitė)

TURINYS
PERŽIŪRA
SUSIETI ĮRAŠAI
ISTORIJA

Korekcija apšvietimo atliktas darbus ir nuolat:

1. Apšvietimo patikrinimo darbai:
 - F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #672
Darbai: N15P-0315-1: sukaje įrengimas"
Aukšta: 3.000 m3
Statybos darbu vieta ir sege jį
 - F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #676
Darbai: K16-402 (D0=1,7) 01: Betoniniu monolitiniu konstrukcijų išardymas
Aukšta: 0.280 m3
Statybos darbu vieta ir sege nurodau.
2. Darbai atlikti pagal projektą:
 - F04-05 Statybos projekcija ir techninė dokumentacija #671
Pavadinimas: Grindys
Numeris: PRC17-551-DP-LA-05
3. Pateikti statybos produktai:
 - F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatavimo sąlygų deklaracija ir įrengimų patikrinimo paaiškinimas ir sertifikatas #641
Statybos produktai ir įrenginiai: Betonas C25/30
Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data: ISD Nr. 0000.000-0000
Dokumenta išdavus įmonė: I: UAB
 - F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatavimo sąlygų deklaracija ir įrengimų patikrinimo paaiškinimas ir sertifikatas #640
Statybos produktai ir įrenginiai: prekinis betonas C25/30
Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data: AI, Dekl. 2017.06.13 Nr. 170613-1
Dokumenta išdavus įmonė: Betono centras
4. Vykdyt darbus buvo nutraukti, nuo projekto:
Atitinka projektą PRC-551-DP-FE.
5. Darbu pradėta: 2021-07-05, pabaiga: 2021-09-09.

KOMISIJOS SPRENDIMAS:

Atlikti darbai atitinka projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. Leidžiama vykdyti tolesnius darbus.
(tolimesnius darbus)

Įrašai apie darbu darbu priemine:

- F25 Įrašas apie darbu pasleptų darbu priemine #674
- F25 Įrašas apie darbu pasleptų darbu priemine #677

Parasai

	Virginija Kanopis Cotenders UAB Remontas	Laukiamo...
	Mantas Kanopis Cotenders UAB Priežiūra	Laukiamo...

PAKVIESTI...

Unikalus nr.

Bled1105-5213-4363-02x1-6820473e088

Sukurta prieš 18 d.
Redaguota: prieš 18 d.

PRISIEGTI...

© Cotenders UAB - Aišiu, kad naudojate StatybosZurnalas.lt - 2023.9.3

Realizuotas abipusis įrašų susiejimas

The screenshot displays the Statybos Zurnalas.lt web application interface. The top navigation bar includes the logo, user profile (Cotenders UAB), and notification (161). The left sidebar contains navigation options like 'Apžvalga', 'Statybos dalyviai', and 'Darbų žiniaraštis'. The main content area shows a document titled 'F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #872'. Below the title are tabs for 'ĮRAŠAI', 'SKYRIAI', 'KNYGOS', and 'ARCHYVAS'. A red box highlights the 'SUSIETI ĮRAŠAI' button, with a red arrow pointing to it. Below this is a table of linked documents:

PAVADINIMAS	ĮMONĖ	PRŠ	DATA
F25 Įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą #874	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89		2021-09-12

The right sidebar shows a preview of the linked document 'F25 Įrašas apie dalinį paslėptų darbų priėmimą #874', including details like 'Būsena: Pasirašomas', 'Statybos dalyvis: AGAIN IT, UAB', and 'Data: 2021-09-12'. At the bottom, a 'Priimti darbai' section shows a task related to 'F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #872'.

Nauja dokumento (projekto) redakcija (laida)

Statybos Zurnalas.lt | NAUJAS ŽURNALAS

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKŲ NAUJA STATYBA

NAUJA REDAKCIJA | ANULIUOTI | KOPIJUOTI | PERKELTI | ATSIŠVIŠTI | SUSIETI | UŽDUOTIS

I šlyktel: Pagrindiniai duomenys apie statinį, sta... / F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #804

NAUJAS IRŠAŠAS | + NAUJA UŽDUOTIS

Apžvalga | Statybos dalyviai | Žurnalo įrašai | Darbų žinaraštis | Užduotys | Pildymo statistika | Pakėtimų istorija | Nustatymai

Planas M iki 2023-12-31:
- 4 iš 99 vertimųjų
- 595 iš 1500 įrašų
- 2 iš 1000 užduočių
- 0.33 iš 15 GB diskų vietos

F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #804

Įrašai | SKYRIAI | KNYGOS | ARCHYVAS

Būviena: Pasiraišomas | Statybos dalyvis: Cotenders UAB | Data: 2020-12-06 | Statinio elementas: Daugiaabutis | Knyga: Knyga Nr. 85 (juodažalis)

TURINYS PERŽIŪRA UŽDUOTYS (1) SUSIETI ĮRAŠAI ISTORIJA

Parašai

Vingirijus Kanaporis Cotenders UAB Rangovas	2020-12-07 13:29
Mantas Kanaporis Mantas Kanaporis Pildytojas	Laikiama

Unikalus nr.: ac44fce2-6b6c-4e54-ad65-d1781a6a7a8e

Sukurta prieš 7 d.
Redaguota dabar

© Cotenders UAB - ADU, kad naudotumėte StatybosZurnalas.lt - 2020.12.4

Statybos Zurnalas.lt | NAUJAS ŽURNALAS

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKŲ NAUJA STATYBA

REDAGUOTI | NAUJAS IRŠAŠAS | IŠBINTI | KOPIJUOTI | PERKELTI | ATSIŠVIŠTI | SUSIETI | UŽDUOTIS

I šlyktel: Pagrindiniai duomenys apie statinį, sta... / F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #804

NAUJA UŽDUOTIS

Apžvalga | Statybos dalyviai | Žurnalo įrašai | Darbų žinaraštis | Užduotys | Pildymo statistika | Pakėtimų istorija | Nustatymai

Planas M iki 2023-12-31:
- 4 iš 99 vertimųjų
- 596 iš 1500 įrašų
- 2 iš 1000 užduočių
- 0.33 iš 15 GB diskų vietos

F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #804

Įrašai | SKYRIAI | KNYGOS | ARCHYVAS

Būviena: Auodraštis | Statybos dalyvis: Cotenders UAB | Data: 2020-12-06 | Statinio elementas: Daugiaabutis | Knyga: Knyga Nr. 85 (juodažalis)

TURINYS PERŽIŪRA SUSIETI ĮRAŠAI ISTORIJA

Parašai

Mantas Kanaporis Mantas Kanaporis Pildytojas	Laikiama
Vingirijus Kanaporis Cotenders UAB Rangovas	Laikiama

Redakcijos

- 2020-12-14 14:04 #2
Sukūrė Vingirijus Kanaporis
- 2020-12-06 22:36 #1
Sukūrė Vingirijus Kanaporis

Unikalus nr.: f81c5d26-cb0c-4f1b-ba81-41ef1b120962

Sukurta prieš 7 min.
Redaguota dabar

© Cotenders UAB - ADU, kad naudotumėte StatybosZurnalas.lt - 2020.12.4

Statybos Zurnalas.lt | NAUJAS ŽURNALAS

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKŲ NAUJA STATYBA

REDAGUOTI | NAUJAS IRŠAŠAS | IŠBINTI | KOPIJUOTI | PERKELTI | ATSIŠVIŠTI | SUSIETI | UŽDUOTIS

I šlyktel: Pagrindiniai duomenys apie statinį, sta... / F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #804

NAUJAS IRŠAŠAS | + NAUJA UŽDUOTIS

Apžvalga | Statybos dalyviai | Žurnalo įrašai | Darbų žinaraštis | Užduotys | Pildymo statistika | Pakėtimų istorija | Nustatymai

Planas M iki 2023-12-31:
- 4 iš 99 vertimųjų
- 596 iš 1500 įrašų
- 2 iš 1000 užduočių
- 0.33 iš 15 GB diskų vietos

F04-05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #804

Įrašai | SKYRIAI | KNYGOS | ARCHYVAS

Būviena: Pasiraišomas | Statybos dalyvis: Cotenders UAB | Data: 2020-12-06 | Statinio elementas: Daugiaabutis | Knyga: Knyga Nr. 85 (juodažalis)

TURINYS PERŽIŪRA UŽDUOTYS (1) SUSIETI ĮRAŠAI ISTORIJA

Parašai

Vingirijus Kanaporis Cotenders UAB Rangovas	2020-12-07 13:29
Mantas Kanaporis Mantas Kanaporis Pildytojas	Laikiama

Redakcijos

- 2020-12-14 14:04 #2
Sukūrė Vingirijus Kanaporis
- 2020-12-06 22:36 #1
Sukūrė Vingirijus Kanaporis

Unikalus nr.: ac44fce2-6b6c-4e54-ad65-d1781a6a7a8e

Sukurta prieš 7 d.
Redaguota dabar

© Cotenders UAB - ADU, kad naudotumėte StatybosZurnalas.lt - 2020.12.4

Įrašų peržiūra

Statybos Zurnalas.lt

161 Cotenders UAB

PAKVIESTI PASIRĄSYTI PERKELTI ATSIŠIŪSTI (PDF)

Žurnalo įrašai 000 Rodyti viską

IRŠAI SKYBIAI KNYGOS ARCHYVAS

Įrašų peržiūra

Pavieka	Nr.	Meno įrašai	Būsena	Knyga	Statybos dalyvis
PAVADINIMAS					ĮMONĖ PRŠ DATA * B
F25 Įrašas apie dalinį pasieptų darbų priėmimą #886				Atitinka projektą PRC17-551-DP-SA-05 Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #885				Testi kitus darbus, juos įvardiname. Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F07 Bendųjų statybos darbų vykdymas #883				N11-171 (S9+1.153): 19. Grindų armavimas, niša(L)/0.480 t Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #887				Nurodyti, kuriuos darbus toliau atliksite Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #875				leidžiama Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89
F25 Įrašas apie dalinį pasieptų darbų priėmimą #884				Atitinka projektą PRC-551-DP-SI-01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F25 Įrašas apie dalinį pasieptų darbų priėmimą #874				atitinka Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #879				Talpinamųjų darbus Daugiabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Bendųjų darbų vykdymas #883				N11-171 (S9+1.153): 19. Grindų armavimas, niša(L)/0.480 t Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88

Statybos Zurnalas.lt

161 Cotenders UAB

PAKVIESTI PASIRĄSYTI PERKELTI ATSIŠIŪSTI (PDF)

Žurnalo įrašai 000 Rodyti viską

IRŠAI SKYBIAI KNYGOS ARCHYVAS

Įrašų peržiūra

Pavieka	Nr.	Meno įrašai	Būsena	Knyga	Statybos dalyvis
PAVADINIMAS					ĮMONĖ PRŠ DATA * B
F25 Įrašas apie dalinį pasieptų darbų priėmimą #886				Atitinka projektą PRC17-551-DP-SA-05 Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #885				Testi kitus darbus, juos įvardiname. Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F07 Bendųjų statybos darbų vykdymas #883				N11-171 (S9+1.153): 19. Grindų armavimas, niša(L)/0.480 t Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #887				Nurodyti, kuriuos darbus toliau atliksite Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88
F24 Pasieptų darbų patikrinimo aktas #875				leidžiama Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89
F25 Įrašas apie dalinį pasieptų darbų priėmimą #884				Atitinka projektą PRC-551-DP-SI-01	Cotenders UAB Knyga Nr. 88

Kaupiamas atliktų darbų žiniaraštis

Statybos Zurnalas.lt

+ NAUJAS ŽURNALAS..

120 Cotenders UAB

ATSISIŪSTI (CSV) + NAUJAS.. IMPORTUOTI..

Darbų kiekių žiniaraštis [Rodyti viską](#)

DARBAI SKYRIAI

Dalyvis: - Visi - Darbų skyrius: - Visi - Būsena: Dirbta (nuo): Dirbta (iki):

DARBAI	KODAS	MAT.VNT.	PLANUOTA	ATLIKTA
2 Šiuokšliadėžės				
2.2 Metalinė šiuokšliadėžė Nr.2 315x315x1020h mm, svoris 28 kg., talpa 50 lt.	0116	vnt	6.0	
4. DRENAŽO ATSTATYMAS				
Drenažo linijų suieškojimas ekskavatoriais	4.11	m2*	649.0	264.0 41%
Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie projektuojamo sausintuvo su visomis reikalingomis jungtimis	4.4	kompl	69.0	

Peržiūrėti įrašus
Redaguoti darbą..

Duomenys iš csv failo

work_items (11).csv - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas **Data** Review View Developer

From Access From Web From Text From Other Sources Existing Connections Refresh All Connections Properties Edit Links Sort Filter Clear Reapply Advanced Text to Columns Remove Duplicates Data Validation Consolidate What-If Analysis Group

H1 fx

	A	B	C	D	E	F	G
1	DARBAI	KODAS	MAT.VNT.	PLANUOTA	ATLIKTA	Unicode (UTF-8)	
2							
3	1. Žemės darbai						
4	Kaminių apskardinimas	N60-10	100m2	0.44	15.00	3409%	
5	Pervadinimo testavimui	FOOBAR	vnt	6.0	17.0	283%	
6	Sankasa	Sank-001	m3*	1,501.0	1,281.0	85%	
7							
8	2. Apdaila						
9	2.1. Signalizacija						
10	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	N21-190	100m	4.00	129.00	3225%	
11							
12	test	21-vas	m3*	200.0	1.0	1%	
13							
14	3. Gelžbetoninės kolonos						
15	Gelžbetoninės kolonos betonavimas	1	m3	4.307	4.307	100%	
16	Gelžbetoninės kolonos klojinių montavimas	2	kmpl	8.0	8.0	100%	
17							
18	4. Stogas						
19	Armuota plėvele stogo dengimas (laikina apsauga nuo kritulių)	N14-60	100m2	7.60	1.60	21%	
20	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis	R61P-2202	m	64.0	18.0	28%	
21	Iki 8m aukščio televizijos ar radijo transl. antenų su vieno aukšto atotampom išmontavimas ir sumontavimas	N50-240	vnt	2.0	15.0	750%	
22	Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartinio purškimo	A26-568	m2	620.0	43.0	7%	
23	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas	A5-141-1	m	40.0	10.0	25%	
24	Gegnių konstrukcijos (iš lentų) netinkamų elementų pakeitimas	A5-141-1	m	40.0	40.0	100%	
25							
26	5. Stogo darbai						
27	Stogo dengimas	STG-111	m2	15.0	25.0	167%	
28							



Statybos techninis
prižiūrėtojas

Stebi atliktus darbus ir žurnalo pildymą

Statybos Zurnalas.lt

AGAIN IT, UAB

TESTINIS PROJEKTAS

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

- Apžvalga
- Žurnalo įrašai
- Darbų žiniaraštis
- Pildymo statistika
- Statybos dalyviai
- Nustatymai

3 iš 99 vartotojų
208 iš 500 įrašų
0.08 iš 5 Gb disko vietos

Statybos darbų žurnalas

Testinis projektas

Mano įrašai [Rodyti viską](#)

Aš sukūriau

13

Turiu pasirašyti

19

Laukiu kitų

3

Pakeitimų istorija [Rodyti viską](#)

2019-01-10, 13:20	Elžbeta Volk atnaujino statybos darbų žurnale dalyvaujančios paskyros „AGAIN IT, UA...
2019-01-10, 13:19	Elžbeta Volk atnaujino statybos darbų žurnale dalyvaujančios paskyros „AGAIN IT, UA...
2019-01-10, 13:18	Virginijus Kanaporis peržiūrėjo įrašą „XX Anuliuojantis įrašas #206“.
2019-01-10, 13:18	Virginijus Kanaporis anuliavo įrašą „F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #199 -- V...
2019-01-10, 13:18	Virginijus Kanaporis iš paskyros „AGAIN IT, UAB“ pasirašė įrašą „XX Anuliuojantis įraš...
2019-01-10, 13:18	Virginijus Kanaporis sukūrė naują įrašą „XX Anuliuojantis įrašas #206“.
2019-01-10, 13:17	Virginijus Kanaporis iš paskyros „AGAIN IT, UAB“ pasirašė įrašą „F07 Bendrųjų statybo...

Unikalus nr.
fae71996-5e8b-4d56-9fe4-313fb40b4d6c

Statybos adresas
J. Basanavičiaus g. 29A
03109 Vilnius
Lietuva

Darbų trukmė
2017-03-10 – 2017-12-31

Leidimo Nr.
12345678901234567890123

https://app.statyboszurnalas.lt/projects/fae71996-5e8b-4d56-9fe4-313fb40b4d6c#...XX Anuliuojantis įrašas #205“

Peržiūri nepasirašytus įrašus

Statybos Zurnalas.lt
+ NAUJAS ŽURNALAS..
🔔 120
⚙️
👤 Cotenders UAB

🔍 PAKVIESTI..
📄 PASIRAŠYTI..
➡️ PERKELTI..

Žurnalo įrašai 474 [Rodyti viską](#)

[RAŠAI]
SKYRIJAI
KNYGOS
ARCHYVAS

Paieska	Nr.	Mano įrašai	Būsena	Anuliuavimas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Visi -	<input type="text"/>	Aktyvūs
Statybos dalyvis	Statiny	Knyga		
- Visi -	- Visi -	- Visi -		
Forma	Darbai	Skyrius		
- Visi -	- Visi -	- Visi -		
Data (nuo)	Data (iki)			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

<input type="checkbox"/> PAVADINIMAS	ĮMONĖ	PRŠ	DATA ↑	B
<input type="checkbox"/> F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #813 N50-270: Daugkartinio veikimo automatinės prie(,) / 15,0 vnt Daugiabutis	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK MK	2020-12-14	○
<input type="checkbox"/> B09-1 Šalčiui neįtraus grunto sluoksnio kontrolinių matavimų žiniaraštis #809 Pk 10 -> Pk12 Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89	MK	2020-12-14	○
<input type="checkbox"/> B10-2 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio priėmimo aktas #811 Pk 10 -> Pk11 Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89	MK	2020-12-14	○
<input type="checkbox"/> B10-1 Šalčiui neįtraus grunto sluoksnio priėmimo aktas #812 Pk 10 -> Pk12 Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89	MK	2020-12-14	○
<input type="checkbox"/> B09-2 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio kontrolinių matavimų žiniaraštis #810 Pk 10 -> Pk11 Administracinis pastatas Statinio Nr. 01	AGAIN IT, UAB Knyga Nr. 89	MK	2020-12-14	○
<input type="checkbox"/> F24 Pasielptų darbų patikrinimo aktas #814 Daugkartinio veikimo automatinės priešgaisrinė(,)	Cotenders UAB Knyga Nr. 85	VK MK	2020-12-14	○

Planas M iki 2023-12-31:

- 4 iš 99 vartotojų
- 596 iš 1500 įrašų
- 2 iš 1500 užduočių
- 0.33 iš 15 GB disko vietos

Susipažįsta su įrašo turiniu

Statybos Zurnalas.lt

TESTINIS PROJEKTAS

+ NAUJAS ĮRAŠAS

Apžvalga

Žurnalo įrašai

Darbų žiniaraštis

Pildymo statistika

Statybos dalyviai

Nustatymai

3 iš 99 vartotojų
208 iš 500 įrašų
0.08 iš 5 Gb disko vietos

PASIRAŠYTI... PAKVIESTI... NAUJA REDAKCIJA... ANULIUOTI... KOPIJUOTI... PERKELTI...

ATSISIŪSTI... SUSIETI...

Šis skyrius: Statybos darbų eiga / F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas

F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #183

Būsena: Pasirašomas | Statybos dalyvis: AGAIN IT, UAB | Data: 2018-07-03 | Statinio elementas: Daugiabutis korpusas D | Knyga: Knyga Nr. 50

TURINYS PERŽIŪRA ISTORIJA

Darbai	0001: Vidinių pamatų po kolonomis įrengimas
Atlikta	10.0 vnt. iš viso 54 iš 134 vnt. (40%)
Statybos darbų vieta ir eiga	asyje 9-11, 1 aukštas.
Atsakingas vykdytojas	Vardenis Pavardenis
Oro sąlygos	Debesuota su pragiedruliais. Temperatūra: 12/16°C. Vėjas: 2m/s. Drėgmė: 88%.

Parašai

	Elžbeta Volk	2018-12-13
	AGAIN IT, UAB	11:25
	Statytojas, Gen. rangovas	
	Virginijus Kanaporis	Laukiamas.
	AGAIN IT, UAB	
	Statytojas, Gen. rangovas	

Unikalus nr.

8a80998e-9a6a-4a82-9687-280606372e4f

F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių sąvybių deklaracija ir įrenginių patų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #180

Betonas C25/30 / 215-12, 2018-12-10

Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas

F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #128

Statybos techninis projektas / 001-11

Daugiabutis korpusas A

181128144747_0001.pdf 36.57 kB

© Ceterand UAB - ADL, kad naudotųė StatybosZurnalas.lt - 2.0.34

Statybos Zurnalas.lt

TESTINIS PROJEKTAS

+ NAUJAS ĮRAŠAS

Apžvalga

Žurnalo įrašai

Darbų žiniaraštis

Pildymo statistika

Statybos dalyviai

Nustatymai

3 iš 99 vartotojų
208 iš 500 įrašų
0.08 iš 5 Gb disko vietos

PASIRAŠYTI... PAKVIESTI... NAUJA REDAKCIJA... ANULIUOTI... KOPIJUOTI...

ATSISIŪSTI... SUSIETI...

Šis skyrius: Statybos darbų eiga / F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas

F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #183

Būsena: Pasirašomas | Statybos dalyvis: AGAIN IT, UAB | Data: 2018-07-03 | Statinio elementas: Daugiabutis korpusas D | Knyga: Knyga Nr. 50

TURINYS PERŽIŪRA ISTORIJA

Darbai	0001: Vidinių pamatų po kolonomis įrengimas
Atlikta	10.0 vnt. iš viso 54 iš 134 vnt. (40%)
Statybos darbų vieta ir eiga	asyje 9-11, 1 aukštas.
Atsakingas vykdytojas	Vardenis Pavardenis
Oro sąlygos	Debesuota su pragiedruliais. Temperatūra: 12/16°C. Vėjas: 2m/s. Drėgmė: 88%.

Parašai

	Elžbeta Volk	2018-12-13
	AGAIN IT, UAB	11:25
	Statytojas, Gen. rangovas	
	Virginijus Kanaporis	Laukiamas.
	AGAIN IT, UAB	
	Statytojas, Gen. rangovas	

Unikalus nr.

8a80998e-9a6a-4a82-9687-280606372e4f

F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių sąvybių deklaracija ir įrenginių patų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #180

Betonas C25/30 / 215-12, 2018-12-10

Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas

F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #128

Statybos techninis projektas / 001-11

Daugiabutis korpusas A

181128144747_0001.pdf 36.57 kB

© Ceterand UAB - ADL, kad naudotųė StatybosZurnalas.lt - 2.0.34

Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #128

Būsena: Pasirašytas

Statybos dalyvis: AGAIN IT, UAB | Data: 2018-11-08

Statinio elementas: Daugiabutis korpusas A

Knyga: Knyga Nr. 46



TURINYS PERŽIŪRA ISTORIJA

Dokumento pavadinimas	Statybos techninis projektas
Dokumento nr.	001-11
Dokumentą parengė	
Dokumentas patvirtintas	
Kas pakvietimą pasiūlė, atliko ir patvirtino	
Dokumentas Pasirašytas	

IMG_8161.JPG 1.90 MB

IMG_8165.JPG 2.04 MB

Prisegtukų peržiūra

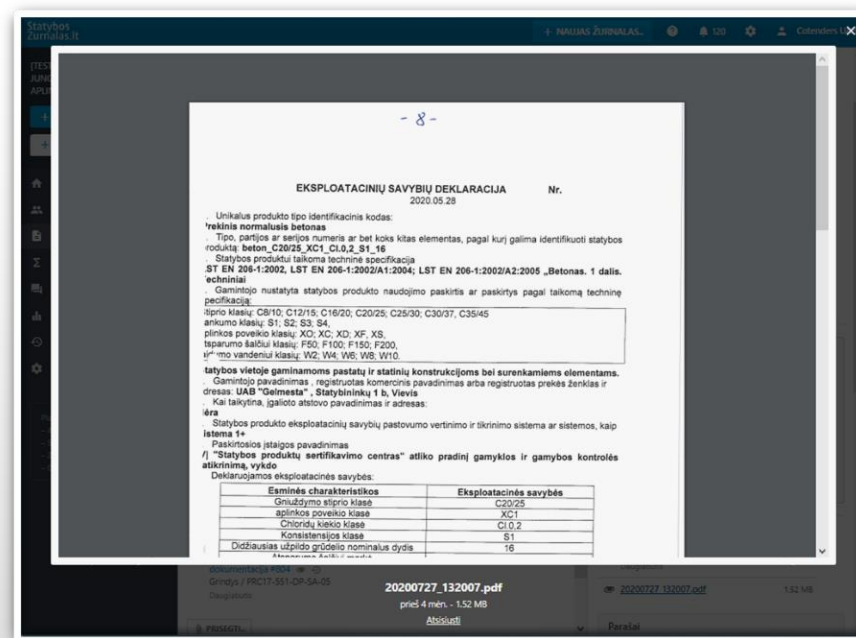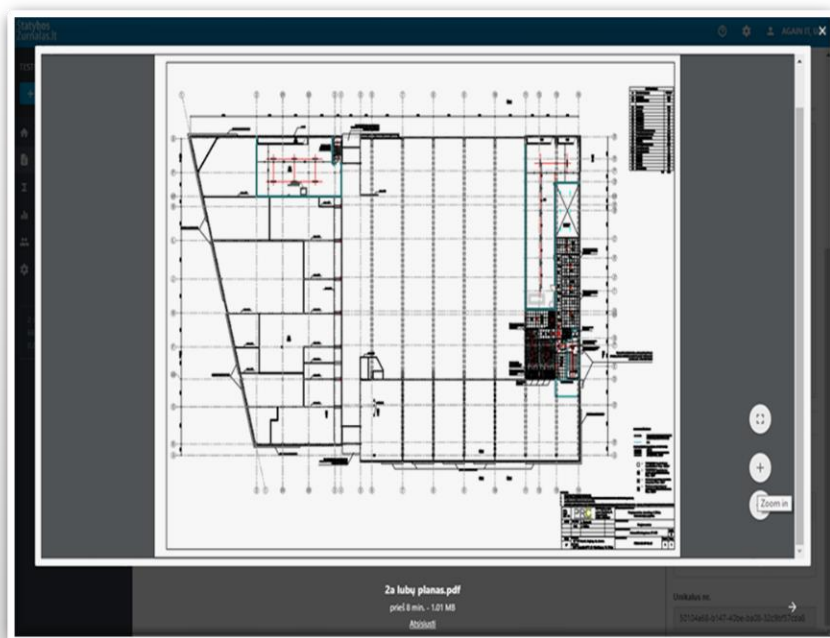



Pasirašo saugiu elektroniniu parašu

Statybos
Zurnalas.lt

🔍 ⚙️ 👤 AGAIN IT, UAB

Įrašų pasirašymas

Prašome įvesti kodą ir pasirašyti pasirinktus įrašus el. parašu.

 F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #183 
0001: Vidinių pamatų po kolonomis įrengimas / 10.0 vnt
Daugiabutis korpusas D

Parašo kodas *

IŠSAUGOTI ATŠAUKTI

© Cotenders UAB · Ačiū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt · 2.0.34

Kontroliuojančių asmenų pastabos susietiems įrašams

The screenshot displays the Statybos Zurnalas.lt web application interface. The top navigation bar includes the logo, a search icon, a settings icon, and the user name 'Cotenders UAB'. The left sidebar contains navigation options: 'Apžvalga', 'Žurnalo įrašai', 'Darbų žiniaraštis', 'Pildymo statistika', 'Statybos dalyviai', and 'Nustatymai'. The main content area shows a document entry for 'F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #504'. A dropdown menu is open under the 'SUSIETI...' button, with a red arrow pointing to it. The dropdown menu lists three options: 'F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba', 'F58 Statybos projekto vykdymo prižiūrėtojo pastaba', and 'F59 Valstybinės priežiūros institucijos pastaba'. Below the document title, there is a table with metadata: 'Būsena: Pasirašytas', 'Statybos dalyvis: Cotenders UAB', 'Data: 2015-07-10', 'Statinio elementas: Daugiabutis korpusas C', and 'Knyga: Knyga Nr. 71 (Pasirašyta)'. The 'TURINYS' section shows a table with columns for 'Statybos produktai ir įrenginiai', 'Dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data', and 'Dokumentą išdavusi įmonė'. The 'Parašai' section shows a signature by 'Virginijus Kanaporis' on '2019-11-26' at '09:01'. The 'Unikalus nr.' section shows the unique identifier '0c0fc509-0b73-4cfc-b20a-51f5834f2c95'. The bottom of the page includes a copyright notice: '© Cotenders UAB · Ašū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt · 2.0.59'.

Kontroliuojančių asmenų pastabos (bendros objektui)

Statybos Zurnalas.lt

1. FORMA / 2. TURINYS / 3. PASIRAŠANTIEJI

Naujas įrašas ☰ NAUJI DARBAI...

I skyrius: Pagrindiniai duomenys apie statinį, statinio projektą ir kitą statybos dokumentaciją
II skyrius: Statybos darbų eiga
III skyrius: Geodezinė kontrolinė dokumentacija
IV skyrius: Paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktai
V skyrius: Statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktai
VI skyrius: Statinio statyboje panaudotų statybos produktų dokumentų ir įrenginių kokybę įrodančių dokumentų registravimas
VII skyrius: Kontroliuojančių asmenų pastabos
■ F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba
■ F58 Statybos projekto vykdymo prižiūrėtojo pastaba
■ F59 Valstybinės priežiūros institucijos pastaba
VIII skyrius: Statybinių ir griovimo atliekų išvežimas iš statyb vietės
Priedas B: Kelių (gatvių) techninė priežiūra

F57 formos pildymas

Statybos
Zurnalas.lt

1. FORMA / 2. TURINYS / 3. PASIRAŠANTIEJI

F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #684

Statybos dalyvis * Cotenders UAB

Data * 2020-04-28

Statinio elementas * Daugiabutis korpusas A

[Redaguoti statinio elementus](#)

Probleminis įrašas

Defekto pašalinimo terminas

Pastabos *

Susieti įrašai

+ PRIDĖTI


IŠSAUGOTI ATŠAUKTI

<https://app.statybozurnalas.lt>

F57 užpildyta forma

The screenshot displays the 'F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #888' page in the Statybos Zurnalas.lt system. The interface includes a top navigation bar with user information (Cotenders UAB) and utility icons. A left sidebar provides navigation options like 'Apžvalga', 'Statybos dalyviai', and 'Žurnalo įrašai'. The main content area features a toolbar with actions like 'PASIRAŠYTI...', 'REDAGUOTI...', and 'IŠTRINTI...'. Below the toolbar, the document title and breadcrumb navigation are shown. A metadata section lists details such as 'Būsena' (Juodraštis), 'Statybos dalyvis' (Cotenders UAB), 'Data' (2021-05-18), and 'Statinio elementas' (Dauglabutis korpusas A > 1 aukštas > Koridorius). A 'TURINYS' (Table of Contents) section lists items like 'Probleminis įrašas', 'Defekto pašalinimo terminas', and 'Pastabos'. A 'Parašai' (Signatures) section shows two signatures: Virginijus Kanaporis and Mantas Kanaporis. A 'Unikalus nr.' (Unique ID) is displayed as 2d8b4cd2-deef-4067-9ee3-b393a63d0588. The footer contains copyright information for Cotenders UAB, 2021.9.3.

Pasirašo mobiliu elektroniniu parašu

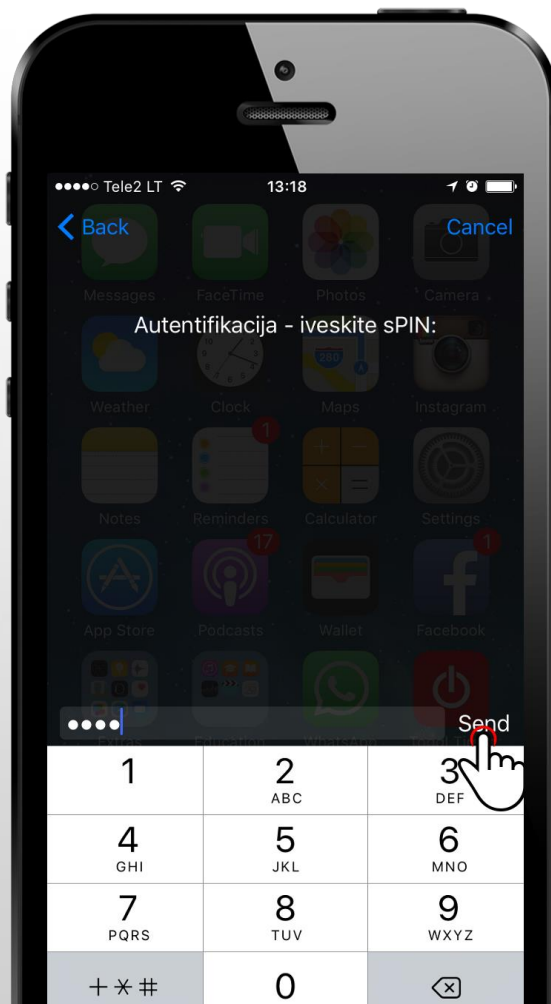

Suformuoja elektroninį dokumentą

Statybos Zurnalas.lt

*Projektas: Prekybos centro „Rimi“ statybos Vytauto g. 60, Uliknergeje
Unikalus dokumento Nr.: a19b03fd-304e-424e-a647-448966e83012*

II SKYRIUS. STATYBOS DARBŲ EIGA
F-10 SANDŪRŲ IR MAZGŲ UŽBETONAVIMO EIGA NR. 4
Fortesta LT, UAB / 2015-07-14

Oro sąlygos: 13 – 19 °C 3 m/s vėjas 66 % drėgmė

Statybos darbų vieta ir eiga: pastabų nėra

Atliktas kiekis: 14 m³

Priimtas kiekis: 14 m³

Atsakingas vykdytojas: Vardenis Pavardenis

Sandūros: mazgai pagal brėžinį (Nr. 124785-1577)

Gaminio pasas: betono serifikatas

Betono temperatūra: 15

Mazgų apšiltinimo būdai: įvairūs būdai

Mazgų šildymo temperatūra: 15

Šildymas užbaigtas: 2015-01-01

Klojiniai nuimti: 2015-01-30

Išbandymo rezultatai: betonas bandymą išlaikė

Užduotys (susirašinėjimai)

Statybos Zurnalas.lt Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS...
+ NAUJA UŽDUOTIS...

Apžvalga
Statybos dalyviai
Žurnalo įrašai
Darbų žiniaraštis
Užduotys 2
Pildymo statistika
Pakeitimų istorija
Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:
- 4 iš 99 vartotojų
- 672 iš 1500 įrašų
- 3 iš 1500 užduočių
- 0.38 iš 15 GB disko vietos

Ne visi susieti įrašai yra pasirašyti! Norėdami pasirašyti šį įrašą, pirmiausiai privalote pasirašyti susietus. (Taip pat įsitikinkite, kad turinyje nėra nuorodų į neegzistuojančius įrašus.)

REDAGUOTI... IŠTRINTI KOPIJUOTI PERKELTI... ATSIŠIŪSTI SUSIETI... UŽDUOTIS...

Vil skyrius: Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos / F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba
F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #889

ĮRAŠAI SKYRIAI KNYGOS ARCHYVAS

Būsena Statybos dalyvis Data Statinio elementas Knyga
Juodraštis Cotenders UAB 2021-05-18 Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas > Koridorius Knyga Nr. 66 (Juodraštis)

TURINYS PERŽIŪRA SUSIETI ĮRAŠAI ISTORIJA

Probleminis įrašas F57 Statybos techninio prižiūrėtojo pastaba #888

Defekto pašalinimo terminas 2021-03-06

Pastabos Pridėjau deklaracijos vertimą

F54 Statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #859
prekinis betonas C25/30 / At. Dekl. 2017.0(,)
Daugiabutis korpusas A > 1 aukštas > Koridorius

PRISEGTL...

Parašai

VK Virginijus Kanaporis Cotenders UAB Rangovas Laukiama...

MK Mantas Kanaporis Mantas Kanaporis Prižiūrėtojas Laukiama...

PAKVIESTI...

Unikalus nr.
64bce3cf-5314-406a-a38d-46f806d8b577

Sukurta: prieš 2 sek.
Redaguota: prieš 2 sek.

© Cotenders UAB · Ačiū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt · 2021.9.3

Nauja užduotis (pasitarimų protokolas)

Statybos Zurnalas.lt + NAUJAS ŽURNALAS... 120 Cotenders UAB

Nauja užduotis

Statinio elementas * Etapas

Daugiabutis korpusas B [ETAPAS:2] Pasitarimai

Pavadinimas * terminas

protokolas 2020-11-24 2020-12-04

Komentaras *

Privatus matomumas (tik Jūsų paskyros nariams bei užduoties dalyviams)

Prisegtukai

Žymos

Susieti dokumentai

Užduočių užbaigimas - komentavimas

Statybos Zurnalas.lt

+ NAUJAS ŽURNALAS.. ? 119 Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

Apžvalga

Statybos dalyviai

Žurnalo įrašai

Darbų žiniaraštis

Užduotys 3

Pildymo statistika

Pakeitimų istorija

Nustatymai

Planas M iki 2024-01-01:
- 4 iš 99 vartotojų
- 600 iš 1500 įrašų
- 3 iš 1500 užduočių
- 0.34 iš 15 GB disko vietos

KOMENTUOTI.. UŽBAIGTI PASKIRTI.. PERLEISTI.. REDAGUOTI.. IŠTRINTI

Užduotis

#1 · Laiptai neisdažyti

UŽDUOTYS ŽYMAS ETAPAI

Statinio elementas
Konstrukcijų dalis (I Etapas)

Statybos dalyvis
Cotenders UAB

Atsakingas
Virginijus Kanaporis AGAIN IT, UAB

Terminas
2021-02-18

KOMENTARAI (2) VEIKSMŲ ISTORIJA

MK Mantas Kanaporis Cotenders UAB prieš 2 mėn.

Man neatidaro tvarkingai

Employee-Agreement builder - Type-of-employment-agreement.png 573.99 kB

MK Mantas Kanaporis Cotenders UAB prieš 2 mėn.

test

KOMENTUOTI..

Dalyviai

AGAIN IT, UAB (n/d)
Statytojas. Gen. rangovas

Cotenders UAB prieš 9 d.
Rangovas

Susieti dokumentai (1)

F15 Geodezinė kontrolinė nuotrauka #803
Išpildomoji nuotrauka
Konstrukcijų dalis (I Etapas)

Sukurta: prieš 2 mėn.
Redaguota: prieš 3 min.

© Cotenders UAB · Ačiū, kad naudojate StatybosZurnalas.lt · 2020.1.3

Užduočių (susirašinėjimo) funkcija

Statybos Zurnalas.lt
+ NAUJAS ŽURNALAS..
?
🔔 119
⚙️
👤 Cotenders UAB

[TESTINIS] J. JANONIO GATVĖS JUNGTIES SU „VIA BALTICA“ APLINKELIU NAUJA STATYBA

+ NAUJAS ĮRAŠAS..

+ NAUJA UŽDUOTIS..

🏠 Apžvalga

👥 Statybos dalyviai

📄 Žurnalo įrašai

📊 Darbų žiniaraštis

🗉 Užduotys 3

📊 Pildymo statistika

🕒 Pakeitimų istorija

⚙️ Nustatymai

+ NAUJAS..
👤 PASKIRTI..
➡️ PERLEISTI..
⬇️ ATSISIŪSTI (CSV)

Užduotys 3 Rodyti viską

UŽDUOTYS
ŽYMAS
ETAPAI

Paiška	Numeris	Būsena	Mano užduotys	Atsakingas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Neišspręstos	- Visi -	- Visi -
Statybos dalyvis		Statinio elementas		Žymos
- Visi -		- Visi -		<input type="text"/>
Etapas		Terminas (nuo)	Terminas (iki)	
- Visi -		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

<input type="checkbox"/> PAVADINIMAS	ETAPAS	ATSK	TERMINAS ↑
<input type="checkbox"/> #1 · Laiptai neisdazyti 🗉 2 🗉 1 Konstrukcijų dalis (I Etapas) Cotenders UAB		VK	2021-02-18
<input type="checkbox"/> #4 · ESD klaida 🗉 1 🗉 1 #Prioritetas: Aukštas Statinys Cotenders UAB	I etapas	MK	2021-01-15
<input type="checkbox"/> #3 · Protokolas 🗉 3 🗉 2 #Prioritetas: Aukštas Statinys Cotenders UAB	I etapas	VK	2020-12-16

Planas M iki 2024-01-01:
 - 4 iš 99 vartotojų
 - 600 iš 1500 įrašų



Inspektorius

Užfiksuoja pastabą ir įkelia nuotrauką

The screenshot displays a web application interface for recording a note. The page title is "F59 Valstybinės priežiūros institucijos pastaba #66". The form includes the following fields and controls:

- Statybos dalyvis ***: Dropdown menu with "AGAIN IT, UAB" selected.
- Data ***: Date input field with "2018-09-12" and a calendar icon.
- Statinio elementas ***: Dropdown menu with "Dauglabutis korpusas A" selected and a "Redaguoti statinio elementus" link below it.
- Probleminis įrašas**: Text input field containing "F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #62" and a search icon.
- Defekto pašalinimo terminas**: Date input field with a calendar icon.
- Pastabos ***: Large text area for notes.
- Susieti įrašai**: Section with a "+ PRIDĖTI" button.
- Buttons**: "IŠSAUGOTI" (Save) and "ATŠAUKTI" (Cancel) buttons at the bottom.

© Cotenders UAB - Aš, kad naudoju StatybosZurnalas.lt - 2.0.31

Kaupiama pakeitimų istorija

Statybos Zurnalas.lt 🔍 ⚙️ 👤 AGAIN IT, UAB

TESTINIS PROJEKTAS

[+ NAUJIAS ĮRAŠAS...](#)

- Apžvelga
- Žurnalo įrašai
- Darbų žinlaštis
- Pildymo statistika
- Statybos dalyviai
- Nustatymai

2 iš 99 vartotojų
66 iš 500 įrašų
0.04 iš 5 Gb disko vietos

Pakeitimų istorija Rodyti viską

Statybos dalyviai: Istorija iki:

Statybos dalyviai	Istorija iki	Keitimų aprašymas	Laikas
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį Elžbeta Volk iš paskyros AGAIN IT, UAB pasirašyti įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #62.	2018-09-12, 14:58
EV Elžbeta Volk		peržiūrėjo įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #62.	2018-09-12, 14:58
EV Elžbeta Volk		atnaujino įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #62.	2018-09-12, 14:58
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį AGAIN IT, UAB pasirašė įrašą F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:57
EV Elžbeta Volk		atnaujino įrašą F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:57
EV Elžbeta Volk		atnaujino įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #46.	2018-09-12, 14:56
EV Elžbeta Volk		peržiūrėjo įrašą F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:52
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį Elžbeta Volk iš paskyros AGAIN IT, UAB pasirašyti įrašą F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:52
EV Elžbeta Volk		įkėlė failą 2a lubų planas.pdf prie įrašo F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:51
EV Elžbeta Volk		įkėlė failą 1a grindų dangos planas.pdf prie įrašo F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:51
EV Elžbeta Volk		peržiūrėjo įrašą F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:51
EV Elžbeta Volk		sukūrė naują įrašą F04/05 Statybos projektinė ir techninė dokumentacija #65.	2018-09-12, 14:51
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį Elžbeta Volk pasirašė įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #64.	2018-09-12, 14:40
EV Elžbeta Volk		peržiūrėjo įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #64.	2018-09-12, 14:40
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį Elžbeta Volk pasirašė įrašą F54 Statybos produkto atitikties deklaracija ir atitiktis sertifikatas arba eksploatacinių sąlygų deklaracija ir įrenginių pasi kokybės pažymėjimas ar sertifikatas #63.	2018-09-12, 14:39
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį Elžbeta Volk iš paskyros Elžbeta Volk pasirašyti įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #64.	2018-09-12, 14:37
EV Elžbeta Volk		priskyrė asmenį Mantas Konaporis iš paskyros AGAIN IT, UAB pasirašyti įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #64.	2018-09-12, 14:37
EV Elžbeta Volk		sukūrė naują įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #64.	2018-09-12, 14:13
EV Elžbeta Volk		atnaujino įrašą F07 Bendrųjų statybos darbų vykdymas #62.	2018-09-12, 13:55

Eksportuoja archyvinę kopiją

Statybos Zurnalas.lt

TESTINIS PROJEKTAS

+ NAUJAS ĮRAŠAS...

Apšvalga

Žurnalo įrašai

Darbų žinlaštis

Pildymo statistika

Statybos dalyviai

Nustatymai

2 iš 99 vartotojų
66 iš 500 įrašų
0.04 iš 5 Gb disko vietos

+ NAUJA...

Archyvinė kopija

Čia galite sukurti ir atsisiųsti statybos darbų žurnalo archyvą (ZIP rinkmeną) su visais įrašais ir knygomis, suformuotomis pildant elektroninio statybos darbų žurnalo formas. Baigus formuoti naują archyvą, gausite pranešimą el. paštu.

FAILAS	DYDIS	UŽSAKĖ	UŽSAKYTAS
archive-201809121510.zip	34.62 MB	Elžbeta Volk	prieš 10 sek.
archive-201711060121.zip	12.60 MB	Mantas Kanaporis	prieš 10 mėn.
archive-201704291635.zip	268.46 kB	Mantas Kanaporis	prieš 1 m.

© Cotenders UAB - ADG, kad naudojate StatybosZurnalas.lt - 2.0.31

archive-202102151210.tar.gz (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan

archive-202102151210.tar.gz - TAR+GZIP archive, unpacked size 2 464 267 325 bytes


Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC
.			File folder		
VIII skyrius: Statybinių ir griovimo atliekų ii(,)			File folder	2021-02-15 12:10	
VI skyrius: Statinio statyboje panaudotų staty(,)			File folder	2021-02-15 12:10	
IV skyrius: Paslėptų darbų ir laikančių konstr(,)			File folder	2021-02-15 12:10	
III skyrius: Geodezinė kontrolinė dokumentacija			File folder	2021-02-15 12:10	
II skyrius: Statybos darbų eiga			File folder	2021-02-15 12:10	
I skyrius: Pagrindiniai duomenys apie statinį(,)			File folder	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 67.pdf	124 679	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 66.pdf	225 791	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 47.pdf	226 893	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 36.pdf	242 757	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 34.pdf	729 714	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 33.pdf	356 397	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 32.pdf	504 010	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 31.pdf	865 260	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 30.pdf	425 391	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 29.pdf	199 486	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 28.pdf	191 137	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 27.pdf	777 329	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 26.pdf	218 336	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	
Knyga Nr. 25.pdf	396 978	?	Adobe Acrobat Document	2021-02-15 12:10	

Užbaigia žurnalą

The screenshot shows the 'Statybos Zurnalas.lt' web application interface. A modal dialog box titled 'Pasirašymas' (Signature) is centered on the screen. The dialog contains the following text: 'Jūsų mobiliąjį telefoną išsiųstas kontrolinis kodas, kurį matote ekrane. Jei kodai mobiliajame telefone ir ekrane sutampa, patvirtinkite operaciją telefone įveddami prašomą sPIN kodą.' Below this text is a text input field containing 'Kontrolinis kodas: 6204'. Underneath the input field, it says 'Laukiama atsakymo, 192'. At the bottom of the dialog is a blue button labeled 'ATŠAUKTI' (Cancel).


The background interface is dimmed and shows a sidebar on the left with the following menu items: 'TESTINIS PROJEKTAS', '+ NAUJAS ĮRAŠAS...', 'Apšilgė', 'Žurnalo įrašai', 'Darbų žiniaraštis', 'Pildymo statistika', 'Statybos dalyviai', and 'Nustatymai'. The main content area is divided into sections: 'Klasifikatoriai' with a 'Darbų skyriai' field; 'Žurnalo savininko keitimas' with a text area and an 'INICIJUOTI SAVININKO KEITIMĄ' button; and 'Žurnalo užbaigimas' with a text area and a 'UŽBAIGTI ŽURNALĄ...' button. On the right side, there are two input fields for 'Statybos kaina' and 'Statybos montavimo darbų kaina', both showing '0,00 €'. The top right corner of the application shows the user 'AGAIN IT, UAB'.

Pasirašo mobiliu elektroniniu parašu

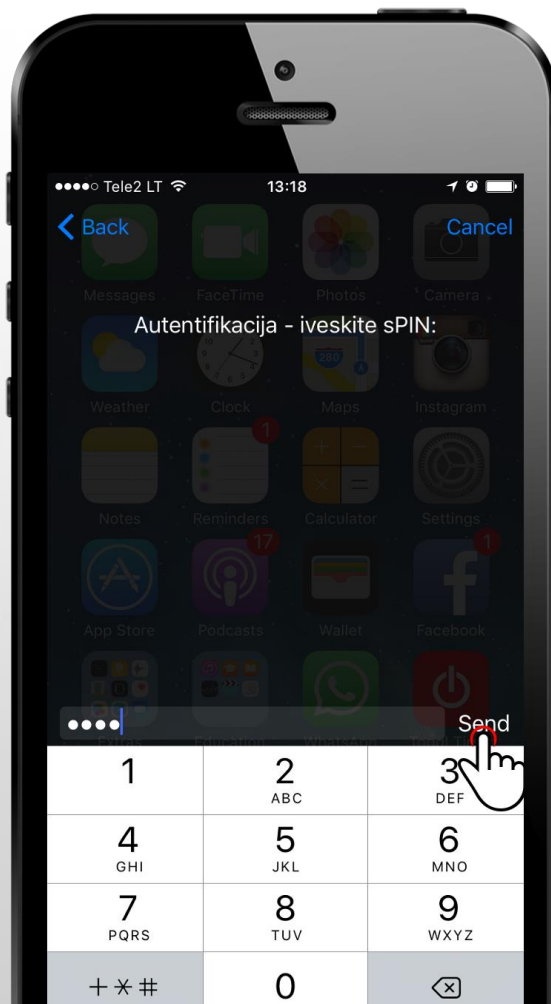

Mano pasirašymui - priminimo varpelis

Statybos Zurnalas.lt		+ NAUJAS ŽURNALAS..		119		Cotenders UAB	
Knygos mano pasirašymui 14		UŽDUOTYS (2)		IRAŠAI (99)		KNYGOS (18)	
NUMERIS	STATYBOS DALYVIS	STATINYS	PRŠ	IRAŠŲ	B		
Knyga Nr. 27 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	AGAIN IT, UAB	101-V10UEA: Atliekų iškrovimo patalpa / Tipping hall	VK MK	1	€		
Knyga Nr. 29 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	AGAIN IT, UAB	101-V10UEA: Atliekų iškrovimo patalpa / Tipping hall	EV VK MK VK	14	⊘		
Knyga Nr. 42 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	Eižbeta Volk	Statinys	VK	1	⊘		
Knyga Nr. 45 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	Eižbeta Volk	Daugiabutis korpusas D	VK	1	⊘		
Knyga Nr. 56 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	AGAIN IT, UAB	Daugiabutis korpusas C [ETAPAS:3]	EV VK	1	⊘		
Knyga Nr. 60 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	Eižbeta Volk	Daugiabutis korpusas D	VK EV VK	1	⊘		
Knyga Nr. 61 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	AGAIN IT, UAB	Bendroji ir susisiekimio dalys (I Etapas)	VK EV	21	€		
Knyga Nr. 63 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	AGAIN IT, UAB	Daugiabutis korpusas C [ETAPAS:3]	VK	1	⊘		
Knyga Nr. 64 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	Cotenders UAB	Daugiabutis korpusas A [ETAPAS:1]	VK MK EV	2	€		
Knyga Nr. 65 [TESTINIS] J. Janonio gatvės jungties su „Via Baltica“ aplinkeliu nauja statyba	Cotenders UAB	Bendroji ir susisiekimio dalys (I Etapas)	VK VK	0	✓		
Knyga Nr. 67	AGAIN IT, UAB	Bendroji ir susisiekimio dalys (I Etapas)	VK EV MK	2	⊘		

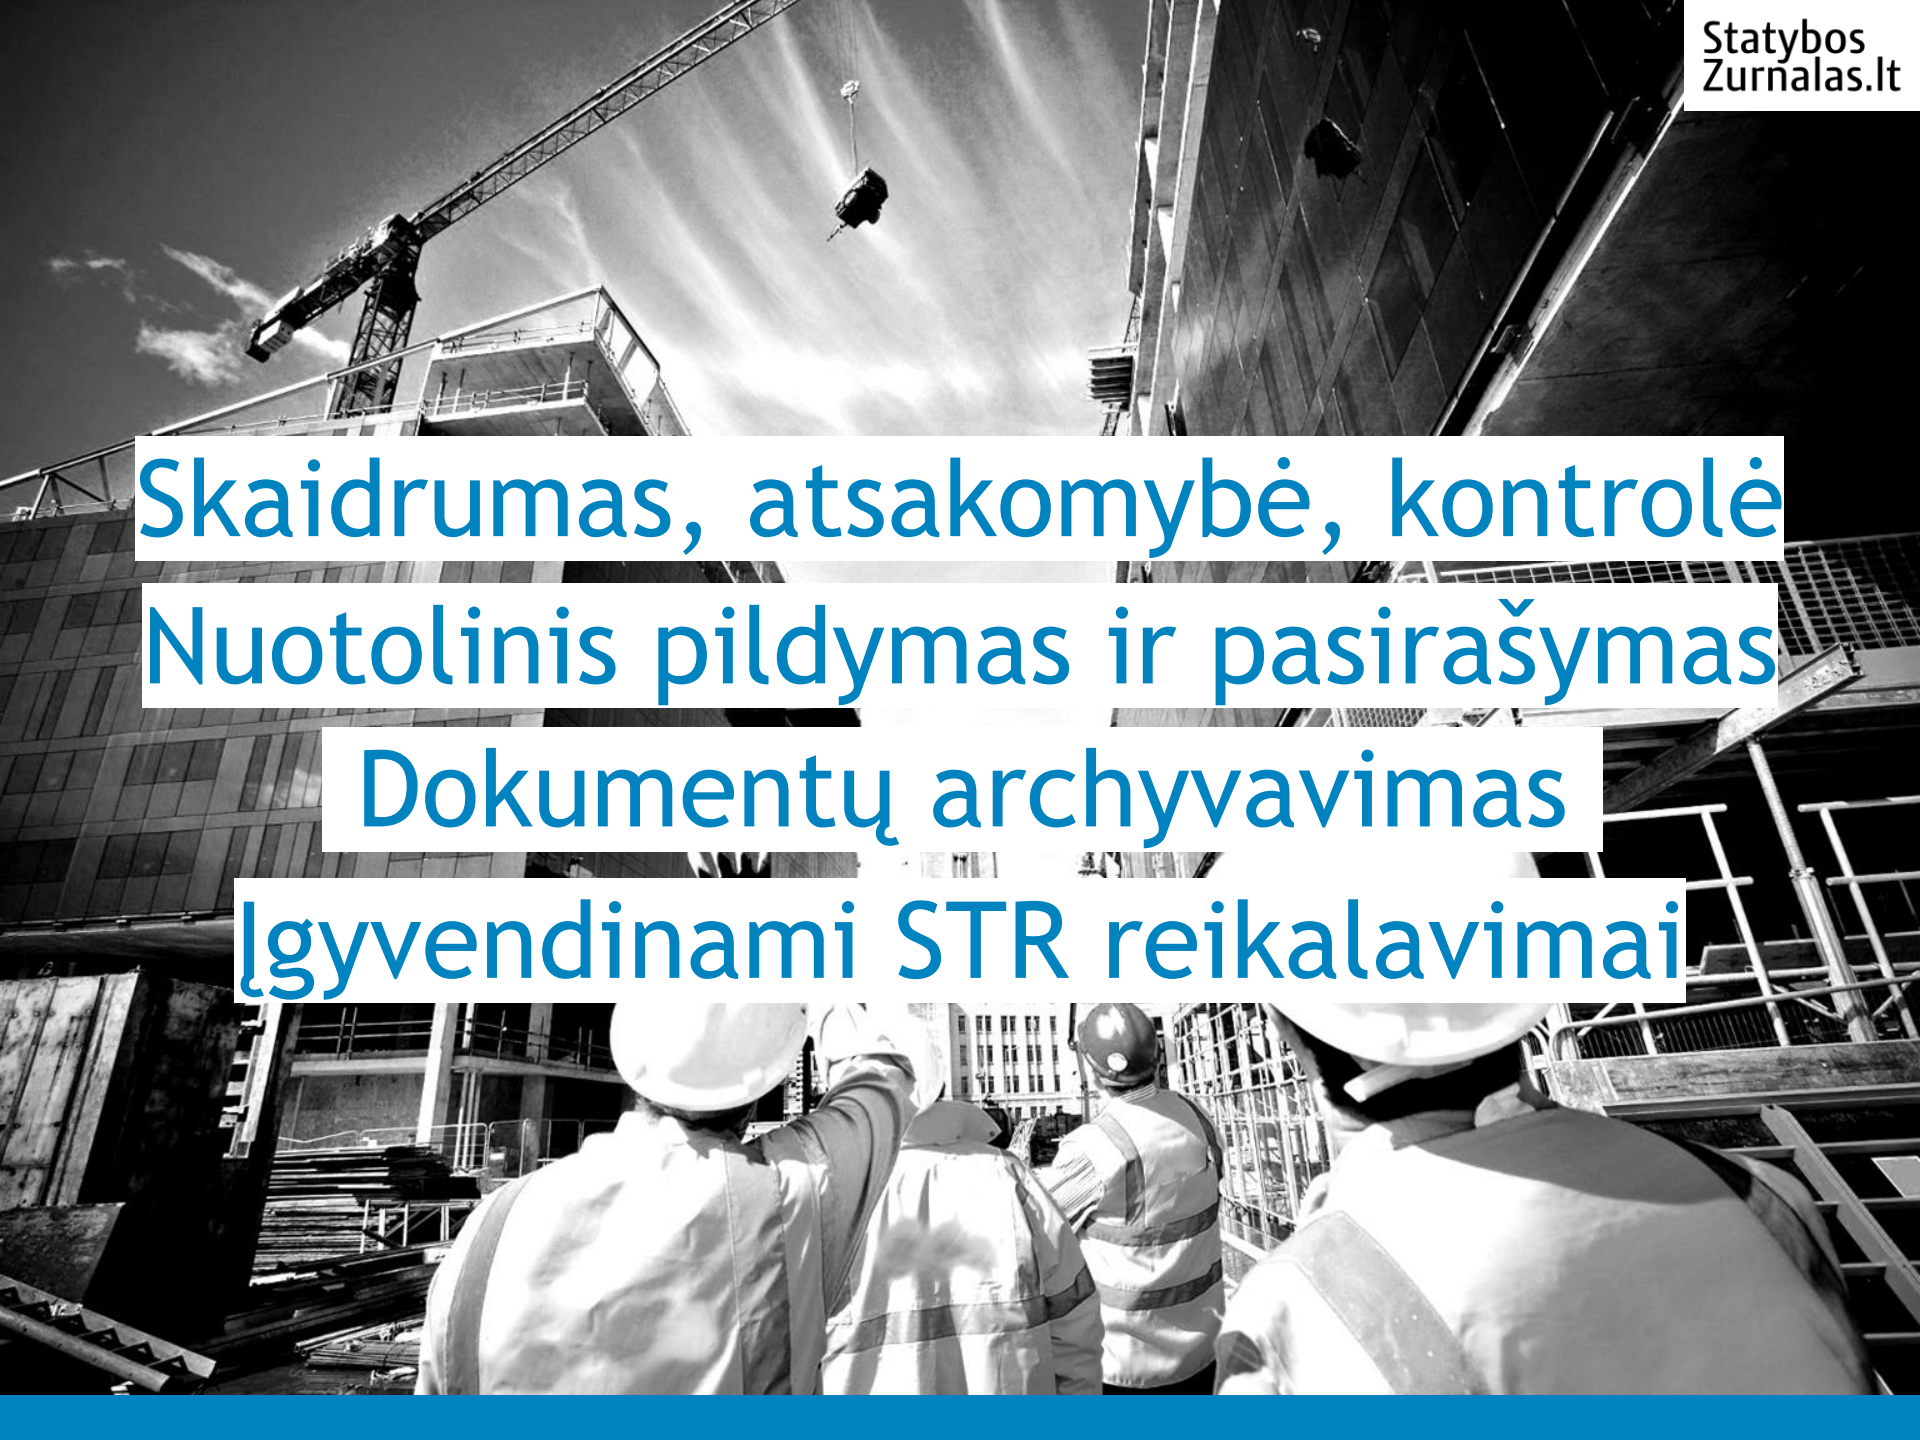A black and white photograph of a construction site. In the upper left, a large tower crane is lifting a heavy load. The background shows a multi-story building under construction with scaffolding. In the foreground, several construction workers wearing hard hats and high-visibility vests are seen from behind, looking towards the building. The sky is bright with some clouds.

Skaidrumas, atsakomybė, kontrolė
Nuotolinis pildymas ir pasirašymas
Dokumentų archyvavimas
Įgyvendinami STR reikalavimai

Pajamų ir sąnaudų legalumas
Nelegalaus darbo kontrolė
Paslaugų teikėjų vertinimas
Išankstinis rangovų kvalifikavimas
Sąsaja su BIM modeliu


Nuo ko pradėti?

Užsakovas

Statybos
objektas

Statybos
dalyviai

StatybosZurnalas.lt Lietuvoje

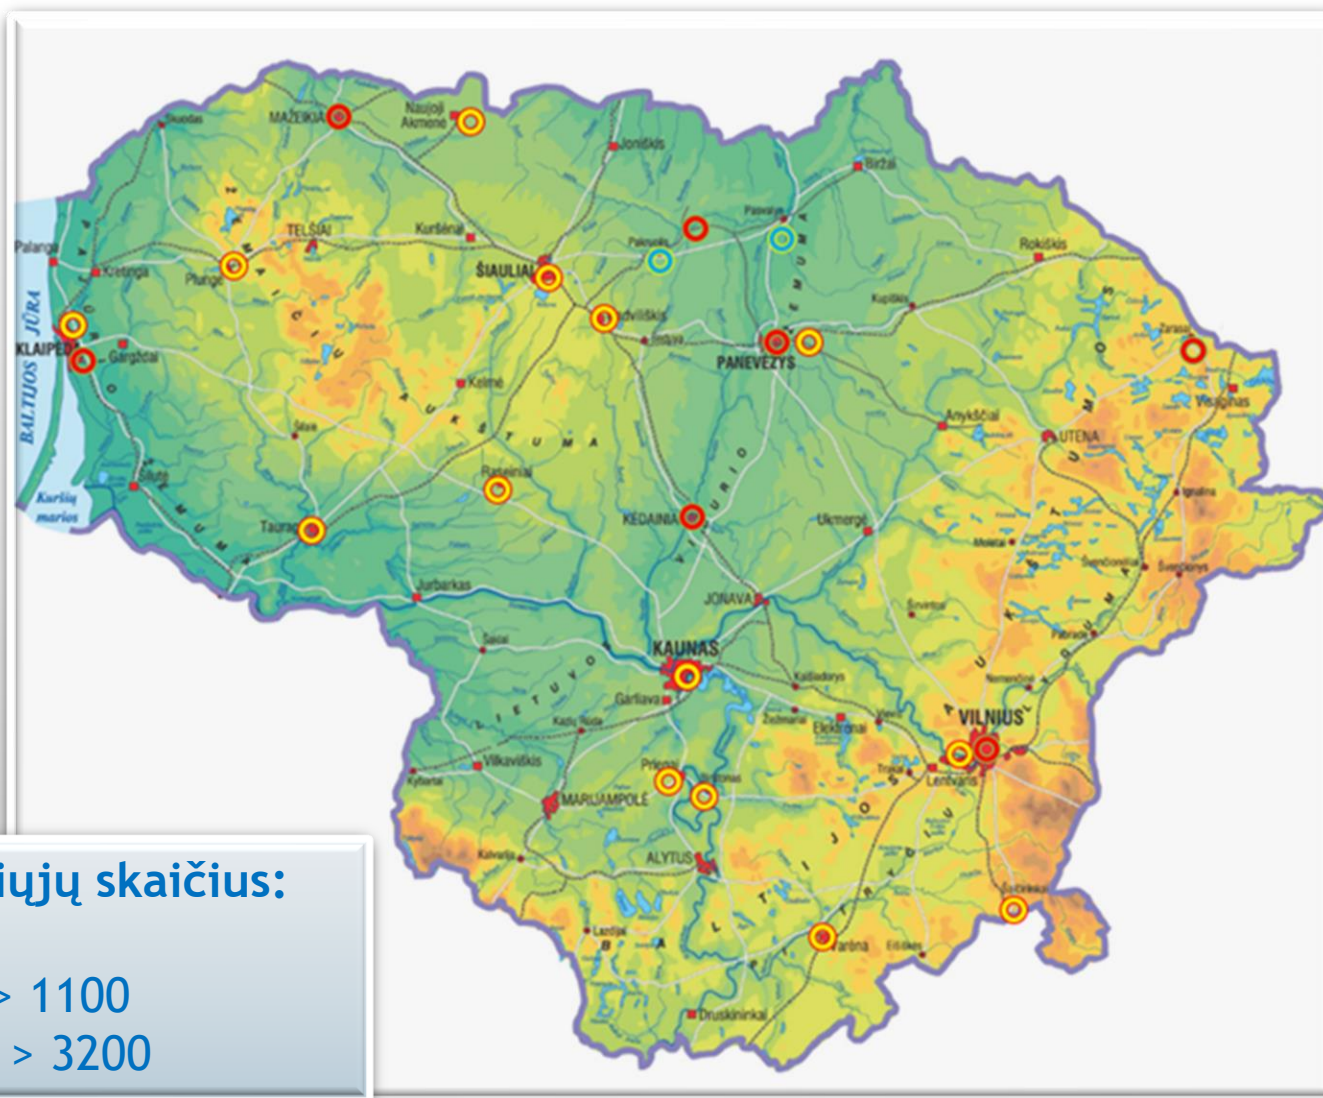

Pildančiųjų skaičius:

Įmonių > 1100

Asmenų > 3200
